年产110万套汽车座椅、座套项目

水土保持方案报告表

建设单位:河南顺成科技有限公司

编制单位:河南宏程矿业勘察设计有限公司

二零二一年三月



(副)

统一社会信用代码 91410823071389236J

名 称 河南顺成科技有限公司

有限责任公司(自然人投资或控股) 类

所 武陟县詹店镇工贸区 住

法定代表人 林海岛

注册资本 壹仟伍佰万圆整

成立日期 2013年06月24日

营业期限 2013年06月24日至2023年06月23日

经 营 范 围 汽车座椅、座垫加工销售、海绵生产销售及海绵原

料购销。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开

展经营活动)



登记机关



公民身份号码 44052719750510005X



中华人民共和国

签发机关 普宁市公安局 有效期限 2014.04.25-2034.04.25

#oo

扫描二维码登录

国家企业信用

信息公示系统, 了解更多登记、 备案、许可、监 管信息。

画

叁佰万圆整 长 沤 串 世

2011年03月11日 期 Ш 村

定

长期 图 單 늵 咖

焦作市解放中路142号学苑宾馆 出 生

207房

米 村

年03 2021

Ш

江

购

经相关部门批准后方可开展经营活动)

月08

国家市场监督管理总局监制

统一社会信用代码 9141080057101385X3

河南宏程矿业勘察设计有限公司 称

加

有限责任公司(自然人投资或控股) 至

米

王条 法定代表人

松

制、水土保持方案编制、水资源论证编制* *(涉及许可经营项目,应取得相关部门许 矿山工程勘察、设计、咨询、技术服务、环境工程设计、建设项目环境影响评价编 可后方可经营)(依法须经批准的项目, # 枳 叫

年产110万套汽车座椅、座套项目 水土保持方案报告表责任页

批准:王东(总经理) 王东

核 定: 谢建国(经理) 净于建图

审查: 高玉华(工程师) 高玉华

校 核:陈中裕(工程师) 用中浴

项目负责人:赵忠明(经理) 💯

报告编写:呼娟娟(技术员)第1-4章、附图

周天琦(技术员)第5-7章

谢建国(工程师)资料调查、附件

年产110万套汽车座椅、座套项目水土保持方案报告表

	位	置	河南省焦作市武陟县詹店镇产业集聚区东区昌平路 中心地理坐标:东经113.62005830°,北纬35.02972402°(GCJ-02坐标)						
			总占地面积41669.06 m²。总建筑面积22326 m²,主要建设有厂房21120 m²和办公楼1206 m²、道路绿化面积19343.06 m²,其中道路面积11521.06 m²,绿化占地面积7822 m²。						
	建设	性质	新	建	总投资 (万元)		42000		
项目概况	土建投资	(万元)	200	00	占	地面积 (m²)	永久: 41669.06 临时:/		
	动工	时间	2019	年1月	Ť	预计完工时间	2021年5月		
	1 1	(2)	挖方	填方		借方	余(弃)方		
	土万	(m ³)	9685	9685		/	/		
	取	土场		I	,	/	1		
	弃土场			/					
项目区概	涉及重点防治区情况		黄泛平原风沙农田保护区 省级水土流失重点预防区		地貌类型		平原		
况	原地貌土壤侵蚀模数 [t/(km².a)]		180		容许土壤流失量 [t/(km².a)]		200		
项目选址 水土保持 评价	水土保持后、除建筑物、道路等硬化区域外、其他区域会部采取植物措施绿化、能够有效防治水土流生								
	预测	则水土流失息	总量(t)		308.38				
	防	治责任范围	(hm²)		4.1669				
			防治标准等级			北方土石山区一级标	准		
H1 (1 1=	N 44 17	水土	流失治理度((%)	95	土壤流失控制比	1.0		
防治标》 及目	标		土防护率(%	,)	97	表土保护率(%)	/		
			植被恢复率(%)		97	林草覆盖率(%)	18.0		

	防治分区	工程措施		植物措施		临时措施	
水土保持措施	建筑物防治区	临时拦挡800 m; 临时苫盖23000 m ²		_		临时排水沟1000 m; 1座沉沙池	
\\\ \ \\\\ \\ \\\ \\\\\ \\\\\\\\\\\\	道路绿化防治区	土地整治7822 m²; 雨水管道667 m; 1座蓄水池		灌木与草皮绿化 7822 m ²		临时苫盖19400 m²	
	工程措施	17.44		植物技	昔施	156.44	
	临时措施	30.99		水土保持补偿费		50002.8 元	
水土保持投资估算 (万元)	VI) # F	建设管理费	Ę			0.1	
()//)///	独立费用	科研勘测设计费				5.0	
	总投资		214.98				
编制单位	河南宏程矿业勘	察设计有限公司	建设单位		ÿī	河南顺成科技有限公司	
法人及电话	王东/1320)3955970	法)	法人及电话		林海岛/13803818305	
地址	河南省焦作市解放中路 河南理工大学万方科技学院		地址		武陟县詹店镇产业集聚区东区昌平路		
邮编 4541		150		邮编	454971		
联系人及电话	赵忠明/13849506295		联系	人及电话		林海岛/13803818305	
电子邮箱	248708128@qq.com		电子邮箱				
传真	_	_		传真		_	

年产110万套汽车座椅、座套项目

水土保持方案报告表

建设单位:河南顺成科技有限公司

编制单位:河南宏程矿业勘察设计有限公司

2021年3月

目 录

1综合说明	1
1.1 项目简况	1
1.2 方案编制依据	3
1.3 设计水平年	4
1.4 水土流失防治责任范围	4
1.5 水土流失防治目标	4
1.6 项目水土保持评价结论	6
1.7 水土流失预测结果	7
1.8 水土保持措施布设成果	8
1.9 水土保持投资及效益分析成果	8
1.10 结论	9
2 项目概况	10
2.1 项目组成及工程布置	10
2.2 施工组织	12
2.3 工程占地	15
2.4 土石方平衡	15
2.5 拆迁安置	16
2.6 施工进度	16
2.7 自然概况	16
3 项目水土保持评价	20
3.1 主体工程选址(线)的水土保持评价	20
3.2 建设方案与布局水土保持评价	22
3.3 主体工程设计中水土保持措施界定	25
4 水土流失分析与预测	27
4.1 水土流失现状	27
4.2 水土流失影响因素分析	27

年产110万套汽车座椅、	座套项目水土保持方案报告表

- 1	=	1 =1.
- 1	_	TV.

4.3 土壤流失量预测	28
5 水土保持措施	32
5.1 防治区划分	32
5.2 措施总体布局	33
5.3 分区措施布设	35
5.4 施工要求	36
6水土保持投资估算及效益分析	39
6.1 投资估算	39
6.2 防治效益分析	44
7 水土保持管理	48
7.1 组织管理	48
7.2 后续设计	48
7.3 水土保持监理	48
7.4 水土保持施工	48
7.5 水土保持设施验收	48

附件:

附件1土地证

附件2委托书

附图:

附图 1 项目地理位置示意图

附图2土壤侵蚀强度分布图

附图 3 水土流失重点防治区划分图

附图4武陟县水系图

附图 5 河南顺成科技有限公司厂区平面图

附图 6 防治责任范围、防治分区及水保措施布设图

附图7厂区现状图

1综合说明

1.1 项目简况

1.1.1 项目基本情况

(1) 项目建设必要性

汽车座椅、座套项目作为汽车产品中的配套产品之一,在国内有着广阔的市场。 随着我国对基础设施投入的加大,交通运输发展得到进一步贯彻落实,市场对汽车和 相关产品的需求在不断增强,尤其是对于汽车座椅、座套等汽车配饰需求量不断增大。 因此,企业投资建设年产110万套汽车座椅、座套的项目,十分必要。

(2) 项目地理位置及交通

本项目位于河南省焦作市武陟县詹店镇产业集聚区东区昌平路,行政区划隶属詹店镇管辖。本项目中心地理坐标:东经113.62005830°,北纬35.02972402°(GCJ-02坐标)。项目北侧为詹郇路,南侧为昌平路,西侧为世纪汇通,东侧为明星电缆。项目区外有郑焦晋高速公路与311省道,区内基础设施较完善,交通较为便利。

项目地理位置及交通见附图1。

(3) 建设性质

本项目为新建工程。

(4) 规模及等级

本项目位于焦作市武陟县詹店镇产业集聚区东区昌平路,总占地面积41669.06 m², 工程占地全部为永久占地,建设内容主要为6栋生产厂房(耐火等级为二级)和1栋办公楼(工程等级为三级,耐火等级为二级)。

(5) 项目组成

本项目由建筑物工程和道路绿化工程2部分组成,总建筑面积22326 m²,建设内容主要为6栋生产厂房和1栋办公楼,占地面积分别是21120 m²和1206 m²。道路绿化区占地11521.06 m²。

(6) 拆迁安置和专项设施改(迁)

根据主体设计,并经现场勘查核实,本项目不涉及拆迁(移民)安置和专项设施

改(迁)问题。

(7) 工期

根据现场调查,本项目已于2019年1月开工建设,预计2021年5月底完工。因此, 本项目施工期为29个月。

(8) 工程投资

本项目总投资42000万元,其中土建投资2000万元,投资资金全部由企业自筹。

(9) 土石方量

本工程总挖填方量为19370 m³, 其中挖方量9685 m³, 建设施工期间随挖随填, 填方量9685 m³, 无余方。开挖土方用于场地平整回填及绿化覆土, 基本达到挖填平衡。1.1.2 项目前期工作进展情况

1、工程设计进展情况

河南顺成科技有限公司于 2016 年 3 月对年产 110 万套汽车座椅、座套项目进行了备案,项目编号:豫焦武陟制造[2016]04721。于 2016 年 10 月编制环境影响报告表,于 2016 年 10 月通过了武陟县环保局审批,审批文号为焦环函[2020]6 号。

2、工程施工进展情况

(1) 主体工程建设情况

本项目已于2019年1月开工建设。截止目前,6座厂房(1~6#厂房,共占地面积21120 m²)和1栋办公楼(占地面积1206 m²)建设完成,已投产使用。道路已采用混凝土硬化(11521.06 m²),已投产使用。

(2) 水土保持措施现状

根据工程现场实际勘察情况及施工单位提供相关资料,施工期采取的措施有临时拦挡,拦挡长度为800 m,已全部实施。对建筑物工程区施工裸露面采取临时苫盖措施23000 m²,已全部实施。道路两侧布设雨水管网共667 m,已全部实施。道路绿化区临时苫盖为19400 m²,土地整治7822 m²,均已实施。植物绿化面积为7822 m²,已实施草皮绿化5000 m²,有2822 m²绿化未完成,预计实施时段为2021年4月至5月。

3、水土保持方案编制情况

2021年3月,河南顺成科技有限公司委托河南宏程矿业勘察设计有限公司(以下简称"我公司")编制本项目水土保持方案。接受委托后,我公司组织工程技术人员对施工现场工程布置、项目周边自然条件、社会经济条件、水土流失概况和项目区水土保持现状等进行了外业勘查和资料收集工作;并对本项目实际建设情况、项目规划设计报告、土建等资料进行分析和计算,于2021年3月编制完成了《年产110万套汽车座椅、座套项目水土保持方案报告表》。本方案属补报水土保持方案。

1.1.3 自然简况

项目区位于河南省焦作市武陟县詹店镇,詹店镇位于武陟县东部。地貌类型为黄河、沁河冲积平原,气候类型属暖温带大陆性季风气候,多年平均气温14.4℃,极端最高气温达43.0℃,极端最低气温-16.7℃,≥10℃积温为4874.8℃。年蒸发量1705 mm,城区多年平均降水量575.1 mm,降水多集中于6~9月,占全年降水量的65%;年最大降水量933.6 mm(1963 年),年最小降水量248.4 mm(1981 年)。10年一遇最大24h降水量147 mm,最大日降水量450 mm,均相对湿度为67%。土壤类型主要为潮土,大部分为中压缩性土层。

项目区水土流失类型在全国水土保持区划中属北方土石山区-华北平原区黄泛平原防沙农田防护区,容许土壤流失量为200 t/km²·a。在水土流失重点防治区划分中属黄泛平原风沙省级水土流失重点预防区。项目区多年平均土壤侵蚀强度为微度,土壤侵蚀模数背景值为180 t/km²·a,植被类型属暖温带落叶阔叶林地带,林草覆盖率为25.2%。

项目所在区域不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园以及重要湿地等。

1.2 方案编制依据

1.2.1 法律法规

- (1)《中华人民共和国水土保持法》(1991年6月29日会议通过;2010年12月25日修订通过,自2011年3月1日起施行);
- (2)《中华人民共和国水土保持法实施条例》(国务院令第120号令发布; 2011 年1月8日修订通过, 自2011年1月8日起施行);

(3)《河南省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》(2014年9月26日会议审议通过,自2014年12月1日实施)。

1.2.2 技术标准

- (1) 《生产建设项目水土保持技术标准》(GB 50433-2018);
- (2) 《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T50434-2018);
- (3) 《水土保持工程设计规范》(GB 5101-2014)。
- (4) 《土壤侵蚀分类分级标准》(SL 190-2007);
- (5) 《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2007)。

1.2.3 技术文件与资料

- (1) 《河南省水土保持规划(2016-2030)》(豫政文〔2016〕131号);
- (2) 《焦作市水土保持规划》(2018-2030);
- (3) 本工程厂区设计图:
- (4) 项目区现状调查资料及建设单位提供其他有关技术资料。

1.3 设计水平年

设计水平年是指水土保持方案确定的水土保持措施实施完毕并初步发挥效益年份, 应为主体工程完工后的当年或后一年,根据主体工程完工时间和水土保持措施实施进 度安排等综合确定。本工程于2019年1月开工,预计于2021年5月底完工,总工期29个 月。因此,本项目设计水平年确定为2021年。

1.4 水土流失防治责任范围

按照《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)的规定,水土流失防治责任范围指生产建设单位依法应承担水土流失防治义务的区域。结合本项目情况,该工程除永久征地外,无临时占地(含租赁土地)和其他使用与管辖区域,因此确定本项目水土流失防治责任范围即为项目建设区范围,主要为项目征占地范围,防治责任范围面积41669.06 m²。

1.5 水土流失防治目标

1.5.1 执行标准等级

本项目属于建设类项目,根据《河南省水土保持规划(2016-2030年)》,项目区位于黄泛平原风沙省级水土流失重点预防区。按照《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T 50434-2018)的要求,本项目水土流失防治标准执行北方土石山区水土流失防治一级标准。

1.5.2 防治目标

根据《生产建设项目水土保持技术标准》(GB 50433-2018),本工程水土流失防治标准等级执行北方土石山区一级标准,并根据一级标准设定的防治目标值,结合项目的工程建设特点、水土流失影响因子(土壤侵蚀强度、项目建设位于詹店镇)等因素调整相关目标值,综合确定本项目应达到的水土流失防治目标值。

按照《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T 50434-2018)的规定,位于城镇区域的项目,防治目标中渣土防护率绝对值比标准要提高1~2个百分点;项目区现状土壤侵蚀强度以微度侵蚀为主,土壤流失控制比取1.0。

该项目区规划为工业用地,建设以厂房为主,用地类型为工业用地,建筑密度较高。根据《工业项目建设用地控制指标》与《城市绿地规划标准》(GB/T51346-2019)规定,林草覆盖率不宜大于20%,本方案在能够满足水土保持要求的基础上适当降低,林草覆盖率防治目标调整为18.0%。

本项目主体工程于2019年1月开工,根据项目的工程特点,场地平整以及建(构) 筑物基础开挖等对表土扰动较大的工作已经完成,项目占地为工业用地,且厂房和道路已全面建成,地面已全面扰动。由于建设方施工前未进行表土剥离,且现状无可剥离表土,因此不对表土保护率进行要求。修正后六项防治标准值如下:水土流失治理度95%,土壤流失控制比1.0,渣土防护率98%,表土保护率不做要求,林草植被恢复率97%,林草覆盖率18.0%。水土流失防治目标取值修正表如下。

表1.5.2.1

水土流失防治目标取值修正表

防治目标	标准规定		《生产建设项目水土 (GB/T 5043	采用标准					
	施工期 运行期 位于微度侵蚀为主		位于微度侵蚀为主 的区域	位于城镇区域	施工期	运行期			
表土保护率	95	95	/	/	/	/			
水土流失治理度	/	95	/	/	/	95			

土壤流失控制比	/	0.9	≥ 1.0	/	/	1.0
渣土防护率	95	97	/	+1	96	98
林草植被恢复率	/	97	/	/	/	97
林草覆盖率	/	25	/	工业用地-7	/	18

1.6 项目水土保持评价结论

1.6.1 主体工程选址评价

本项目位于水土保持敏感区,黄泛平原风沙省级水土流失重点预防区,通过逐条对照《中华人民共和国水土保持法》、水利部[2007]184号《关于严格开发建设项目水土保持方案审查审批工作的通知和《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)及《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T 50434-2018)中,选址的限制性规定逐条分析,项目建设除位于黄泛平原风沙省级水土流失重点预防区外,本项目选址基本符合国家水土保持法律、法规、规定对于生产建设项目的选址要求。按照《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T50434-2018)要求,执行北方土石山区一级标准进行防治。因此,从主体工程选址水土保持方面评价,工程建设可行。

1.6.2 建设方案与布局评价

(1) 工程建设方案评价

从水土保持角度分析,项目选址除无法避让黄泛平原风沙省级水土流失重点预防 区范围外,基本合理,符合总体规划。经优化方案,在满足主体工程安全运行的同时, 尽量减少土方挖填和移动量,尽可能的减少扰动地表面积水土流失量。工程总体布局 紧凑,能够减少对原地貌、地表植被的占用和破坏,减少对周边生态环境的影响,因 此,工程总体布局基本符合水土保持的要求。

(2) 工程占地评价

工程占地41669.06 m²,全部在用地红线内,为永久占地,用地类型为工业用地,基本符合珍惜、合理利用土地和切实保护耕地的基本原则,符合水土保持的要求。

(3) 土石方平衡评价

本工程通过合理施工与布设,基本做到区内土方挖填平衡,工程不设弃渣场。本工程工期为29个月,施工过程无法避开雨季,通过施工期对地表裸露面进行临时苫盖,

在建筑物工程区进行土料填筑拦挡、修建土质排水沟和沉沙池等拦挡措施,防止造成水土流失危害。从水土保持角度来说,土石方平衡符合水土保持规定要求。

(4) 施工方法评价

主体工程施工组织设计基本可行,施工场地在项目用地红线范围内建设围墙,占地控制严格,施工安排基本合理。项目施工期间,合理安排施工时序,基本做到随挖随填,减少地表裸露面积。建设方在土方运输过程中采取遮盖、车轮冲洗,缩短运输距离等措施,基本符合水土保持要求。

(5) 主体设计中具有水土保持功能工程评价

根据现场调查和资料分析,主体工程设计中可界定为水土保持措施的工程包括: 建筑物区,建筑物基坑周围修建临时拦挡和施工裸露面用土工布临时苫盖;道路绿化 区主要为土地整治,施工裸露面临时苫盖,永久排水管网的布设和管网开挖时的临时 堆土苫盖及灌木、草皮绿化措施,基本符合水土保持规范,为进一步完善水土保持措 施,本方案新增水土保持相关措施,如临时排水、沉沙和蓄水池等。

综上所述,主体工程的选址、占地、土石方、施工工艺以及对水土流失的影响因素基本符合规范要求,确定本项目可行。为减轻水土流失程度,制定本方案,通过本方案对主体工程水土保持措施进行补充和完善,能够有效地防治工程建设造成的水土流失、最终改善生态环境、维护生态平衡,从水土保持角度分析,本项目建设可行。

1.7 水土流失预测结果

- (1) 经计算,本项目水土流失总量为308.38 t,新增土壤流失总量为281.65 t,其中施工期土壤流失总量283.5 t、自然恢复期土壤流失总量24.87 t。建筑物区167.45 t,道路绿化区140.93 t。
- (2) 根据水土流失预测结果,产生水土流失的重点时段为施工期;重点部位为建筑物工程区。

根据预测结果得知,建筑物工程区在施工过程中新增水土流失量较大,具体表现为在没有任何防护措施的情况下,土方开挖、回填等水土流失可达剧烈程度。因此,水土流失重点防治时段为施工期,重点防治区域为建筑物工程区。

(3) 工程建设过程中,项目建设区内的原地貌将会被严重扰动,导致地表土层也河南宏程矿业勘察设计有限公司 7

遭到破坏,这大大地降低了地表土壤的抗蚀能力,加重水土流失,将引发沟蚀、面蚀等多种形式的水力侵蚀发生。

- (4) 土方的开挖、回填等施工过程,严重影响了这些单元土层的稳定性,为水土流失创造了条件。如不及时做好排、疏、导工程,将直接对工程施工的正常进行和运营安全造成影响。
- (5)项目建设活动产生大量的松散堆积物,极易形成水土流失,降低水利工程防 洪效益,影响区域生态环境安全。
- (6) 工程建设过程中将产生大量的土方搬运,如不加强管理和防护,任意堆弃将可能被降雨、径流冲入河道,从而造成河道淤积,在影响防洪安全的同时,可能造成水源水质污染。另外,遇大风天气易产生扬尘,影响生态环境和空气质量。

1.8 水土保持措施布设成果

根据划分建筑物和道路绿化区2个防治分区,水土保持措施布设因地制宜、因害设防铺设雨水管网、绿化、修建蓄水池,布设临时拦挡、临时苫盖、临时排水沟、沉沙池等临时防护措施,形成永久性措施与临时性措施相结合、主体已有与方案新增措施相结合的综合防治体系。各防治区水土保持工程量汇总如下:

(1) 建筑物工程防治区

主体工程设计主要设置临时拦挡800 m, 已全部实施,实施时段为2019年1月至2019年12月;对施工裸露面采取临时苫盖措施23000 m²,已全部实施,实施时段为2020年1月至今。

新增: 1000 m临时排水沟和1座沉沙池。

(2) 道路绿化工程防治区

道路两侧布设雨水管网共667 m,实施时段为2020年7月至2020年8月;临时措施为裸露面临时苫盖,面积为19400 m²,已全部实施,实施时段为2019年1月至2021年3月。主体工程设计为土地整治7822 m²,已实施,2020年9月至12月;植物绿化7822 m²,已实施草皮5000 m²,有2822 m²绿化未完成,预计实施时段为2021年4月至5月。新增1座蓄水池用于绿化养护。

1.9 水土保持投资及效益分析成果

(1) 水土保持投资估算成果

本项目建设期水土保持估算总投资214.98万元,其中本方案新增水保投资5.13万元, 主体设计水保防治费199.73万元(工程措施17.44万元、临时措施30.99万元、植物措施 156.44万元)。独立费用5.1万元,其中建设管理费0.1万元,科研勘测设计费5.0万元, 水土保持补偿费50002.8元。

(2) 水土保持效益分析结论

各项水土保持措施实施后,设计水平年水土流失治理达标面积41669.06 m²,减少土壤流失量308.38 t。6项防治指标值可达到:水土流失治理度为99.9%,超过防治目标值95%;土壤流失控制比为1.11,超过防治目标值1.0;渣土防护率100%,超过防治目标值98%;林草植被恢复率100%,超过防治目标值97%;林草覆盖率18.77%,超过防治目标值18.0%。本项目已建成投产,场地平整以及建(构)筑物基础开挖等对表土扰动较大的工作已经完成,且平整和开挖过程中未对表土进行剥离,本方案不再设计表土剥离措施,表土剥离土方量也不再进行计算,故不再计算表土防护率防治指标。

1.10 结论

项目建设从选址(线)、建设方案、水土流失防治等方面符合水土保持法律法规、技术标准的规定。通过各项水土保持措施的实施,能够达到水土流失防治目标,实现项目区被破坏的环境得到恢复和改善。从水土保持角度分析本工程建设是可行的。

2项目概况

2.1 项目组成及工程布置

2.1.1 地理位置及项目交通情况

本项目位于武陟县詹店镇产业集聚区东区昌平路,项目区外有311省道和昌平路, 交通便利,能够满足施工要求和材料运输。

2.1.2 项目建设基本内容

年产110万套汽车座椅、座套项目占地41669.06 m²,总建筑面积22326 m²,建设地上建筑有6栋厂房占地面积为21120 m²和1栋办公楼占地面积为1206 m²、道路占地面积11521.06 m²,绿化占地面积7822 m²。同时配套给水,雨水管网等设施。项目组成情况表2.1.2.1。

表2.1.2.1

项目组成情况表

	项目名称		年产110万套汽车座椅、座套项目					
	建设地点	武陟县詹店	镇产业集聚日	区东区昌平路	所在流域	海河流域		
	建设单位	河南	「顺成科技有阝	限公司	工程性质	新建		
	工程总投资		42000万元		土建投资	2000万元		
项目基本	工程建设期		2019年1月~20	021年5月(总工期2	9个月)			
情况	建设规模		总列	建筑面积22326 m²				
1月 火山	项目组成	占地面积 (m²)	占地性质		备注			
	建筑物工程	22326	永久占地	生产厂房21120 m²,办公楼1206 m²。				
	道路绿化工程	19343.06	永久占地	区内道路11521	.06 m²、绿化	∠7822 m²		
	合计	41669.06	永久占地		_			
西日1十	项目组成	挖方 (m³)	填方 (m³)	调运方 (m³)	余方	(m^3)		
□ 项目土方 量	建筑物工程	9518	7146	建筑物调出2372	负物调出2372 ┃ 0			
(m^3)	道路绿化工程	167	2539	建筑物调入2372		0		
(111)	合计	9685	9685	/		0		
	方专项设施改建	 本项目用地不涉及拆迁安置与专项设施改建。						
,	情况							
		本工程施工所需建筑材料包括砂、石料、石灰、钢材、木材、水泥和沥						
		青等,可在当地市场购买。所需大型浇筑采用商品混凝土,由混凝土专						
┃ 砂、石来	源及防治责任			要选择正规厂家,				
				工作由材料供应单位	位负责,在多	签订购买协		
		议中应明确供应为						
				工用电就近利用现				
施工用	月水、用电			引电线电缆至施工:	场地。同时放	拖工单位自		
		备发电机组,共门	司满足施工用	电的需求。				

表2.1.2.2

项目主要技术指标表

	项目	单位	数量	备注
	用地面积	m^2	41669.06	/
其	永久占地	m^2	41669.06	/
中	临时占地	m^2	0	/
	总建筑面积	m^2	22326	/
++	1-5# 厂房	m^2	19200	每座80 m×48 m 1层
其中	6# 厂房	m^2	1920	80 m×24 m 1层
	办公楼	m^2	4824	1206 m ² ×4层
	容积率	/	0.62	/
建筑密度		%	53.58	/
	绿地率	%	18.77	/

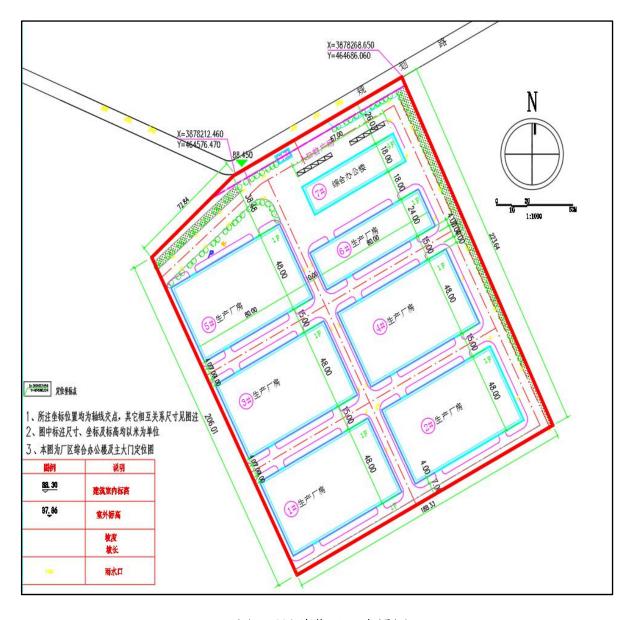


图1项目总体平面布置图

2.1.3项目总体布置

(1) 平面布置

本项目建设内容主要为6座厂房和1栋4层办公楼均为地上建筑为主。总平面布置如图1,厂区现状见附图7。规划用地为近正方形,总用地面积41669.06 m²。

建筑物区占地面积22326 m²,建筑物由北向南分列布置,项目区北侧布设一个出入口并建设1栋4层办公楼。入口向南分2列布置6栋生产厂房均为1层轻钢结构建筑,建筑物总体布置有序。

厂区内道路围绕生产厂房呈环形布置,占地面积11521.06 m²。在厂房外围和办公生活区外围为绿化区域面积为7822 m²,全部为永久占地。路面为混凝土路面,道路总长1152.11米,道路平均宽度为10 m,满足消防与生产对道路交通的要求。绿化区域主要布设在项目区厂房四周空闲区域,植物配置以"四季常青"为原则,主要以灌木与草坪相互配合,满足绿化与生产的要求。

(2) 竖向布置

根据建设单位提供的地勘报告资料,结合现场调查,厂区地形较平坦,现状高程为88.3 m。根据建设施工方案,共建设6座轻钢结构厂房和1栋砖混结构办公楼。其中5座厂房长均为80 m,宽为48 m,其余1座厂房长为80 m,宽为24 m。厂房基础按照四周柱基和中间柱基的方式开挖。柱基长约1.7 m~2.4 m,宽约1.5 m~2.4 m,基础埋深为1.5 m~1.8 m。办公楼长为67 m,宽为18 m,条形基础埋深为1.5 m。开挖产生的部分土方用于建筑施工结束后基坑回填、垫高压实其建筑基底等,部分用于场地平整。结合项目区排水、道路衔接、场地土石方等因素,最终确定建筑物室内设计标高88.4 m,道路标高为88.3 m。

2.2 施工组织

2.2.1 施工力能

(1) 施工用水、用电

施工水源利用詹店镇产业集聚区内的集中供水,本工程采用生产、生活共用给水管网。施工用电利用附近电网供电,本工程采用10kV高压双回路供电,由临近厂区两

个不同市政开闭所提供, 两条高压互为备用, 满足厂区供电要求。

(2) 排水

本项目排水体制为雨污分流制。生活污水经化粪池处理后排入詹店新区污水处理 厂做进一步处理。雨水经蓄水池(筹建)沉淀后,用于绿化养护用水。

(3) 施工通信

项目所在地通讯网络发达,中国移动、中国联通和中国电信等通讯网络覆盖整个区域。工程施工通讯、网络由通讯部门就近利用现有通讯基础设施将通讯光缆、网络光缆通至施工场地,不产生扰动地表。同时工程施工、管理、监理等单位自备移动通讯设备,可以满足工程建设期间的临时通信需要,不再建设专用临时通信设施。

(4) 供气

本项目生产过程中使用的天然气,为武陟中裕燃气供气。

(5) 采暖、制冷

本项目生产车间不需要采暖和制冷,生活区采暖和制冷采用分体式空调。

(6) 主要建筑材料来源及防治责任

本工程建筑材料及建筑设备均可在当地购买。在外购砂石料等涉及水土保持问题的,需在购买合同中说明水土保持责任归材料供应方。

(7) 周边配套管网情况

经调查,项目建成后地块内出入及给排水均倚重于北侧的詹郇路,目前项目区北侧的詹郇路为已建市政道路,道路两侧现敷设有完整的市政供水、雨水、污水、电力、通信等管网,设施齐全,满足本工程供排水、供电等要求。

2.2.2 施工布置

(1) 施工生产生活区

本项目施工生产生活区采用就近租赁附近房屋的措施,不再另行增加临时占地,本方案不再布设水土保持措施。

(2) 施工道路

现状道路能满足施工需求, 无需新建场外临时施工道路, 各种建设材料可直接运输至施工位置。项目区内环形施工道路亦可满足施工需要。

(3) 临时堆土场地

施工开挖产生的临时堆土主要为建筑物基础开挖土方,临时堆存于建筑物周边空地,并采取临时防护措施,及时回填。

2.2.3 主要施工方法与工艺

(1) 场地平整

场地平整在施工期进行,根据设计标高,采用机械设备进行土方开挖。该阶段土方挖填方量最大,本工程主体设计根据地形条件,结合工程特点,采取挖高填低的方式,合理控制土方开挖。

(2) 建(构)筑物基础开挖及回填

基础开挖主要包括建筑物基础开挖、场内供水管线、雨水管沟等开挖,施工时严格按照设计图纸统筹安排,施工时序。建筑物基础开挖时必须服从基坑支护要求,在确保基坑稳定安全的前提下,先用反铲挖掘机开挖到基础底标 30 cm 左右,余土人工清挖,防止出现超挖现象。基坑回填须待各构筑物结构施工完且验收合格后方可进行,避免重复开挖。土方回填时事先抽掉积水,清除污泥杂物,回填土利用开挖的原土,并清除掺入的有机质,回填土的含水率控制在15%~25%之间。回填采用小型机械蛙夯夯实,夯实时采用连环套打法,夯迹双向套压,局部人工压实,应逐层水平填筑,逐层碾压。宜避开雨季施工,严禁大雨期间进行回填施工,并应做好防雨及排水措施。

(3) 管道敷设工程

管线工程施工时,要做好各种管沟及预埋管道的施工及管线敷设安装,以满足各种管线的排布及通行。验槽合格后,方可进行回填。

主要施工工序为:测量放线→沟槽开挖→地基处理→支撑→铺设垫层→铺设管网→回填。

(4) 道路施工

道路工程施工工艺包括,路基清基采用挖掘机和推土机,路基填筑采用挖掘机和推土机挖土,自卸汽车运土的施工方法,土料经掺石灰等工程处理后填筑路基,路面施工采用拌和设备集中拌和,自卸汽车运输,平地机铺筑和压路机碾压的方式。

(5) 绿化

项目区设计灌木与草皮相互配合方式,待厂区建筑物建设完成后,进行灌木移植,同时铺设草皮进行绿化,合理布设厂区绿化,可有效防护水土流失。

2.3 工程占地

根据项目前期资料,结合实地踏勘,本工程总占地41669.06 m²,占地类型为工业用地,占地性质为永久占地。

按项目组成划分:建筑物区占地22326 m²,道路绿化区占地19343.06 m²。工程占地情况详见下表。

表2.3.1

工程建设占地面积统计表

项目组成	 占地面积 (m²)	占地性质	占地类型	
	口地画你(III-)	永久占地	工业用地	
建筑物区	22326	永久占地	工业用地	
道路绿化区	19343.06	永久占地	工业用地	
合计	41669.06	永久占地	工业用地	

2.4 土石方平衡

2.4.1 表土剥离

本项目已于2019年1月开工建设,根据现场调查情况,目前6座生产厂房和1栋办公楼已建成,道路已采用混凝土硬化。由于施工过程中场地平整以及建(构)筑物基础开挖等对表土扰动较大的工作已经完成,且平整和开挖过程中未对表土进行剥离,尚未完成的工程均在平整(垫高)后的场地上进行,不涉及原场地表层土,故本方案不再设计表土剥离措施,表土剥离土方量也不再进行计算。

2.4.2工程土石方量及土石方平衡

本项目地貌类型为平原区,主体工程土方量主要是建筑物基础开挖、场地平整、路基平整等。根据主体设计资料和施工资料,本项目建设期间总挖方约9685 m³,建筑物区总挖方9518 m³,道路区排水管网开挖土方约167 m³;开挖土方进行厂区平整2419 m³,余方0 m³。

表2.4.2.1

土石方平衡表

防治分区		挖方	填方 (m³)	调入量 (m³)		调出量 (m³)		余方 (m³)
		(m^3)		数量	来源	数量	去向	数量
	土方	9518	7146	0	/	2372	道路绿化工程区	0
建筑物工程区	表土	0	0	0	/	0	/	0
	合计	9518	7146	0	/	2372	道路绿化工程区	0
	土方	167	2539	2372	建筑物工程区	0	/	0
道路绿化工程区	表土	0	0	0	/	0	/	0
	合计	167	2539	2372	建筑物工程区	0	/	0
总计		9685	9685		/			

2.5 拆迁安置

根据项目资料,结合现场调查,本项目不涉及拆迁安置问题。

2.6 施工进度

本工程已于2019年1月开工,根据现场调查情况,本项目为封闭施工场地,工程建设全部在用地红线内进行,用地红线外无临建设施,工程计划于2021年5月竣工,总工期29个月。

表2.6.1

施工进度表

		201	9年		2020年		2021年			
分区	第1	第2	第3	第4	第1	第2	第3	第4	第1	第2
	季度	季度	季度	季度	季度	季度	季度	季度	季度	季度
建筑物工程区										
道路绿化工程区										

截止现阶段,6座厂房和1栋办公楼建设完成。1~6#厂房,共占地面积21120 m²,1栋办公楼占地面积1206 m²均投产使用。道路区已完成11521.06 m²混凝土硬化路面,已投产使用。绿化区域正在进行植树种草,已实施5000 m²。项目区内由于生产厂房和办公楼的基础开挖及道路铺设雨水管网工程产生的基坑已经回填,且尚未完成的绿化工程均在平整后的场地上进行。本项目土石方开挖即用,且不外借土方和不产生废弃土方。

2.7 自然概况

2.7.1地质

(1) 地质构造

武陟区域内广泛发育了燕山运动以来形成的各种构造形迹,断裂构造尤为发育,多为高角度正断层。受断裂构造控制,项目位于新华夏系太行山隆起的南端与晋东南山字型构造东翼反射弧的前缘和东秦岭纬向构造带之北缘相交联合弧地带,区内广泛发育燕山运动以来所生成的多种构造形迹,多以正断层为主,断层倾角较大,多在60°以上。

(2) 水文地质

武陟县为黄、沁河冲积平原,水文地质条件较好,其地下水主要来源为降雨补给、 黄河沁河侧渗、灌区的渗漏和田间灌溉的入渗补给,地下水流向东北,其贮存量分布 不均衡,县东地下水丰富。

(3) 不良地质情况

根质据区域地资料,拟建场地基本稳定。项目区处在黄沁河冲积平原区,地质条件较好,不存在崩塌、滑坡、泥石流等不良地质现象,建设条件良好。

项目区及其附近地带无影响工程稳定的不良地质因素,为稳定场地,适宜项目建设。

2.7.2 地貌

项目区位于焦作市武陟县,地处黄河、沁河冲积微度起伏的平原,太行山南麓的褶裙斜坡与黄河冲积扇接触地带,由第四纪松散沉积物组成,属于华北平原的一部分,总的地势较为平坦。由于历经黄、沁河改道的影响和长期侵蚀作用,地貌比较复杂,类型较多,可分为洪积冲积平原、砂丘及丘间砂地、古黄河滩地、河漫地、岗地、洼地6种地貌类型。

本项目位于詹店镇产业集聚区东区昌平路,项目地块整体上呈现正方形,地势较为平坦,原地面标高88.3 m。主体工程竖向设计根据现状地形,设计建筑物室内设计标高88.4 m。

2.7.3 气象

项目区属于暖温带大陆性季风气候,四季分明,春季干旱多风,夏季湿热多雨, 秋高气爽,冬寒少雪。项目区多年平均气温14.4℃,历年极端最高气温43.0℃,极端最 低温-16.7℃, ≥10℃积温为4874.8℃。年蒸发量1705 mm, 城区多年平均降水量575.1 mm, 降水多集中于6~9月, 占全年降水量的65%; 年最大降水量933.6 mm(1963年), 年最小降水量 248.4 mm(1981 年)。10年一遇最大24 h降水量147 mm, 最大日降水量450 mm, 均相对湿度为67%。

表 2.7.3.1

多年主要气象要素一览表

气象要素	武陟县	气象要素	武陟县
极端最高气温(℃)	43.0	全年≥10℃积温	4874.8℃
极端最低气温(℃)	-16.7	10年一遇最大 24h 降水量	147 mm
年均气温(℃)	14.4	年最小降雨量	248.4 mm
年均降水量(mm)	575.1	年最大降水量	450 mm
年均蒸发量(mm)	1705	年均相对湿度(%)	67

2.7.4 水文

(1) 地表水

武陟县境内的地表水系分属黄河和海河两大水系。黄河流域包括沁南地区和黄、 沁河两滩,主要过境河流有黄河、沁河、蟒河、济河和二四区涝河;海河流域包括县 东和沁北地区,主要河流有大沙河、蒋沟及一干排、二干排、共产主义渠、大狮涝河。 武嘉渠、蒋沟河及一干排、大狮涝河。武陟境内地下水丰富,水位稳定,水质良好, 适宜居民饮用和工业用水。

沁河是焦作市最大的河流,发源于山西省沁源县。向东流经沁阳、博爱、温县, 在武陟县注入黄河,过境长度90余公里。沁河径流资源丰富,河口站多年平均流量 49.5 m³/s,其中基流量16.1 m³/s,占总流量的32.5%,含沙量低,稳定可靠。

大沙河为卫河的源头支流,发源于山西省太行山区,流经河南省博爱县、焦作市区、修武县、获嘉、辉县,在新乡县西永康北汇入共产主义渠,干流全长115.5 km,流域面积2688 km²;在焦作市境内干流长74 km,主要一级支流有幸福河、蒋沟河、新河以及山门河。

蒋沟河属海河流域漳卫河水系,大沙河支流,发源于博爱县月山镇七方村北,流经博爱县、武陟县和示范区,在示范区北高村汇入大沙河。蒋沟河控制流域面积366 km²,全长39.95 km,博爱县境内流域面积171.1km²,长度约24.87 km;示范区内流域面积103.9 km²,长度约3.79 km;武陟县境内流域面积91 km²,长度约11.29 km。

(2) 地下水

武陟县为黄、沁河冲积平原,水文地质条件较好,其地下水主要来源为降雨补给,黄河、沁河侧渗,灌区的渗漏和田间灌溉的入渗补给,地下水流向东北,其贮存量分布不均衡,县东引黄流灌溉渠地下水丰富。

项目属于海河流域,项目区无河流水渠,项目区地下水静水位埋深 6.2-6.5 m。

2.7.5 土壤

根据项目区土壤普查资料,武陟县土壤分为2个土类,3个亚类,10个土属,48个土种。项目区地处平原区,土壤类型主要为潮土。土壤性质介于壤土与沙土之间,有效土层厚度大于1.0 m,土壤质地较轻,适宜杨树生长;土壤养分含量较高,其中有机质含量大于0.4%,含氮大于0.03%;土壤无盐碱或轻度盐碱,土壤平均容重为1.36 t/m³,土壤空隙率为45%。

2.7.6 植被

武陟县植被主要以华北区系植物为主,属暖温带落叶阔叶林区,主要乔木有泡桐、107 速生杨、欧美杨、刺槐、白榆、柳树等;灌木有冬青、小叶女贞、金叶女贞、法国冬青、栀子花等;经济林树种主要有枣树、柿树、苹果、桃、杏、核桃等;草本植物繁多,主要有桔梗、白草、紫花苜蓿、狗尾草等。粮食作物以小麦、水稻、玉米、大豆为主。经济作物以花生、棉花、油菜、四大怀药(山药、牛膝、地黄、菊花)为主,栽培的林木有用材林和经济林。城镇绿化主要为公园、草地、绿化带、行道树为主、绿化率12%。

2.7.7 其他

项目区不涉及引用水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园, 重要湿地等。

3项目水土保持评价

3.1 主体工程选址(线)的水土保持评价

根据《中华人民共和国水土保持法》、《关于严格开发建设项目水土保持方案审查审批工作的通知》(水利部水保[2007]184号)和《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018),对厂区的现场调查和设计资料分析,并咨询有关部门,对本项目主体工程选址制约性因素进行分析,详见表 3.1.1~3.1.3。

表3.1.1 《中华人民共和国水土保持法》规定的限制性因素分析评价

序号	《中华人民共和国水土保持法》原文	本项目的情况	评价	相应措施
1	第十七条:禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从 事取土、挖砂、采石可能造成水土流失的活动。	本项目不属是 塌、滑坡危易 和泥石流。易 区,且不涉及 土、挖砂、 等内容。	佐人西北	
2	第十八条:水土流失严重、生态脆弱的地区,应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动,严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。	本项目不属于水 土流失严重、生 态脆弱的地区。	符合要求	
3	第二十四条:生产建设项目选址、选线应当避让水土流 失重点预防区和重点治理区;无法避让的,应当提高防 治标准,优化施工工艺,减少地表扰动和植被损坏范 围,有效控制可能造成的水土流失。			执行北方土 石山区一级 防治标准。
4	第二十五条:在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流失的生产建设项目,生产建设单位应当编制水土保持方案,报县级以上人民政府水行政主管部门审批,并按照经批准的水土保持方案,采取水土流失预防和治理措施。没有能力编制水土保持方案的,应当委托具备相应技术条件的机构编制。	本项目位于黄泛 平原风沙省级水 土流失重点预防 区。		建设单位已委托"我公司"编制本项目水上保持方案报告书。
5	第二十八条:依法应当编制水土保持方案的生产建设项目,其生产建设活动中排弃的砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等应当综合利用;不能综合利用,确需废弃的,应当堆放在水土保持方案确定的专门存放地,并采取措施保证不产生新的危害。	本项目挖填方平 衡,无借方,无		
6	第三十二条:在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动,损坏水土保持设施、地貌植被,不能恢复原有水土保持功能的,应当缴纳水土保持补偿费,专项用于水土流失预防和治理。专项水土流失预防和治理由水行政主管部门负责组织实施。水土保持补偿费的收取使用管理办法由国务院财政部门、国务院价格主管部门会同国务院水行政主管部门制定。	本项目属于生产	应水补专水预理缴保费用流和。	根据《水土保持补偿费征收使用管理办法》,本项目应按1.2元/m²,征占地41669.06m²,计列水土保持补偿费。

表3.1.2

开发建设项目的制约性因素分析评价

序号	184号文有关规定	本项目的情况	评价
1	《促进产业结构调整暂行规定》(国发〔2005〕40号)、 国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》 〔2019年〕中的限制类和淘汰类建设项目。	本项目属生产制造类项目,不 属于限制类和淘汰类项目。	符合
2	《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》确定的禁止开发区域内不符合主体功能定位的开发建设项目。	本项目不在禁止开发区域。	符合
3	违反《水土保持法》第二十条,在25度以上陡坡地实施的 农林开发项目。	本项目不属于农林开发项目。	符合
4	违反《水土保持法》第十七条,在县级以上地方人民政府 公告的崩塌滑坡危险区和泥石流易发区内取土、挖砂、取 石的开发建设项目。	本项目区域不属于公告的区 域。	符合
5	违反《中华人民共和国水法》第十九条,不符合流域综合规划的水工程。	本项目不属于水工程。	符合
6	根据国家产业结构调整的有关规定精神,国家发展和改革 主管部门同意后方可开展前期工作,但未能提供相应文件 依据的开发建设项目。	本项目已取得武陟县发改委备 案。	符合
7	分期建设的开发建设项目,其前期工程存在未编报水土保持方案、水土保持方案未落实和水土保持设施未按期验收的。	本工程不属于分期建设项目的 后期项目。	符合
8	同一投资主体所属的开发建设项目,在建及生产运行的工程中存在未编报水土保持方案、水土保持方案未落实和水 土保持设施未按期验收的。	经咨询,建设单位承建的项目 均编报了水保方案。	符合
9	处于重要江河、湖泊以及跨省(自治区、直辖市)的其他 江河、湖泊的水功能一级区的保护区和保留区内可能严重 影响水质的开发建设项目,以及对水功能一级区的饮用水 源区水质有影响的开发建设项目。	本项目占地不涉及任何水源保 护区。	符合

表3.1.3

工程选址的水土保持分析预评价

序号	要求内容	本项目的情况	评价	解决办法
1	选址(线)应避让水土流失重点预防区和重点治理区	本项目选址无法避让水土流失重点预防区	不符合	执行一级防治标 准并提高相应防 治指标
2	选址(线)应避让河流两岸、湖泊和 水库周边的植物保护带	本项目不占用	符合	/
3	选址(线)应避让全国水土保持监测 网络中的水土保持监测站点、重点试	本项目不占用	符合	/

序号	要求内容	本项目的情况	评价	解决办法
	验区及国家确定的水土保持长期定位			
	观测站			

通过逐条对照《中华人民共和国水土保持法》、《水利部关于严格开发建设项目水土保持方案审查审批工作的通知》(水保[2007]184号)和《生产建设项目水土保持技术标准》(GB 50433 - 2018)等法律、法规和技术规范、文件要求,本项目除属于黄泛平原风沙省级水土流失重点预防区外,其余全部符合国家水土保持法律、法规、规定对于生产建设项目的选址要求。对于项目建设位于黄泛平原风沙省级水土流失重点预防区,可以按照《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T50434-2018)要求,执行北方土石山区一级标准进行防治。因此,从主体工程选址水土保持方面评价,工程建设可行。

3.2 建设方案与布局水土保持评价

3.2.1建设方案评价

本项目建设方案与《生产建设项目水土保持技术标准》(GB 50433-2018)的约束性规定分析与评价结果详见表 3.2.1.1。

表3.2.1.1 《生产建设项目水土保持技术标准》约束性规定分析与评价

《生产建设项目水土保持技术 标准》(GB 50433-2018)约 束性规定	主体设计或工程实际情况	分析评价及处理意见
3.2.2 节第 1 条 公路、铁路工程在高填深挖路段,应采为大大路。 域少大大挖;填高大于20 m,挖茶代大挖;填高大于20 m,挖茶代支,大大路,应进行桥隧替代证,路堤、路堑在保证边防,路堤、路、采用植物防护。 电过力 植物防护相结合的设计方案。	本工程为新建塑料制品加工项 目,不涉及公路、铁路工程。	/
3.2.2节第3条 山丘区输电工程 塔基采用不等高基础,经过林 区的应采用加高杆塔跨越方 式。	本工程为新建塑料制品加工项 目,不涉及山丘区输电工程。	/

3.2.2 节第 4 条对无法避让水土 | 本工程为新建塑料制品加工项 流失重点预防区及重点治理区 的生产建设项目,建设方案应 符合下列规定: 1、应优化方 案,减少工程占地和土石方 量;公路铁路等项目填高大于 8m 官采用桥梁方案: 管道工程 穿越宜采用隧道、定向钻、顶 管等方式; 山丘区工业场地宜 优先采取阶梯式布置。2、截排 水工程、拦挡工程的工程等级 和防洪标准应提高一级。

目,位于黄泛平原风沙省级水 土流失重点预防区, 无法避 让。

按照《生产建设项目水土流失 防治标准》(GB/T 50434-2018) 要求,对无法避让水土 流失重点预防区的,建议后续 施工过程中尽量优化施工方 案,采用北方土石山区一级标 准进行防治。

根据表3.2.1.1 分析,本项目工程布局紧凑、建设方案基本可行,对无法避让黄泛 平原风沙省级水土流失重点预防区,通过采用优化方案、提高渣土防护率防治指标 等方式予以解决,以减少项目建设造成的新增水土流失。

项目所在区域不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然 保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园以及重要湿地 等。主体工程选址、建设方案及布局合理,不存在限制性因素,符合水土保持有关 约束性规定。从水土保持角度分析,项目选址除无法避让黄泛平原风沙省级水土流 失重点预防区范围外,基本合理,符合总体规划。工程总体布局紧凑,能够减少对 原地貌、地表植被的占用和破坏,减少对周边生态环境的影响,因此,工程总图布 局基本符合水土保持的要求。

3.2.2 工程占地评价

本项目总占地面积41669.06 m², 为永久占地, 用地类型为工业用地, 占地符合 武陟县用地规划,项目建设单位已于2018年7月18日在武陟县取得不动产权手续,产 权证号豫(2018)武陟县不动产权第0002330号,符合用地要求。施工过程中,项目 周边修建有围墙, 施工活动均在围墙内进行。施工供水、施工供电均布置在永久征 地范围, 在满足施工需求的同时能够有效减小新增占地, 建筑物工程施工结束后及 时对永久占地进行路面硬化或绿化,工程占地符合节约用地和减少扰动的要求。工 程占地基本符合珍惜、合理利用土地和切实保护耕地的基本原则,符合不破坏就是 最大的保护的环保理念,项目无固废产生,没有占有生产力较高的土地,基本符合 水土保持的要求。

3.2.3 土石方平衡评价

项目施工中合理安排施工时序,基本做到随挖随填,减少地表裸露面积;通过合理施工与布设,做到了区内土方挖填平衡,工程不设弃渣场;本工程工期为29个月,施工过程无法避开雨季,通过施工期对地表裸露面进行临时苫盖,在建筑物工程区进行土料填筑拦挡、修建土质排水沟和沉沙池等拦挡措施,防止造成水土流失危害;从水土保持角度来说,土石方平衡符合水土保持制约性规定要求。

3.2.4 取土 (石、沙) 场设置评价

根据主体设计及现场勘察,本项目不设取土(石、砂)场。

3.2.5 弃土 (石、沙) 场设置评价

根据搜集资料和现场调查,项目总挖方 0.97 万 m³,总填方量 0.97 万 m³,无弃方,不设弃渣场。

3.2.6 施工方法评价

主体工程施工组织设计基本可行,施工场地在项目用地红线范围内建设围墙,占地控制严格,施工安排基本合理。项目施工期间,合理安排施工时序,基本做到随挖随填,减少地表裸露面积。建设方在土方运输过程中采取遮盖、车轮冲洗等,缩短运输距离等措施,基本符合水土保持要求。

3.2.7 主体工程设计中具有水土保持功能工程的评价

根据现场调查及结合施工资料分析,工程已实施可界定为水土保持措施的工程包括以下方面:

(1) 建筑物区

根据现场勘查,建筑物区进行了临时拦挡和临时苫盖措施,满足水土保持要求。 本方案补充临时排水和沉沙措施。

(2) 道路绿化区

根据现场勘查,结合施工资料,建设方设计了土地整治,进行了施工裸露面临时苫盖,建设单位在道路两侧敷设雨水排水管网与詹店镇产业集聚区的雨水管网顺接,满足水土保持要求。建设单位设计在道路两旁采取灌木与草皮结合进行植物绿化,

新增蓄水池用于苗木绿化。

主体设计中具有水土保持功能工程的分析评价见表 3.2.7.1。

表 3.2.7.1 主体工程设计和已实施的具有水土保持功能工程的分析评价

防治分区	措施类型	 具有水土保持功能的设计内容	评价	本方案需要补充完善
N H N E	指施兴型 共有水土休村功能的以订内谷		的措施	
建筑物区 临时措施 临时苫盖、临时拦挡 缺少相关		缺少相关措施	临时排水沟、沉沙池	
	工程措施	土地整治、雨水管网铺设	缺少相关措施	蓄水池
道路绿化区	临时措施	临时苫盖	满足设计要求	/
	植物措施	绿化	满足设计要求	/

3.3 主体工程设计中水土保持措施界定

3.3.1 水土保持措施界定原则

根据《生产建设项目水土保持技术标准》(GB 50433-2018)第4.3.11条规定,水土保持工程界定的应符合下列规定:

- (1) 应将主体工程设计中以水土保持功能为主的工程界定为水土保持措施:
- (2) 难以区分是否以水土保持功能为主的工程,可按破坏性试验的原则进行界定;即假定没有这些工程,主体设计功能仍然可以发挥作用,但会产生较大的水土流失,此类工程应界定为水土保持措施。
- 3.3.2 界定为水土保持工程的措施分析

3.3.2.1 水土保持措施实施情况

本项目于2019年1月开始施工。截至目前,6座生产厂房和1栋办公楼已建成。道路全部完成混凝土路面硬化。

经与建设单位沟通,结合现场实地调查,本项目设计水保措施为土地整治、铺设 雨水、污水管网、植树种草绿化、临时拦挡、临时苫盖等措施。

3.3.2.2 界定为水土保持工程的措施和投资

根据对现场已实施的水土保持措施调查以及水土保持措施界定原则,已实施可界 定为水土保持措施的工程包括以下方面:

(1) 建筑物区

根据现场实际调查并咨询施工单位可知,设计进行临时拦挡800 m;为降低建筑物区在建设期间对周围环境的影响,从施工准备期开始至当前时间,主体设计对施工裸露区采用土工布进行苫盖,苫盖面积约23000 m²。

(2) 道路绿化区

道路绿化区的土地整治、雨水管道和临时苫盖界定为水土保持措施。土地整治面积7822 m²。共布设雨水管网667 m。临时措施主要是临时苫盖约19400 m²。

3.3.3 主体工程设计的水土保持工程量及投资

主体工程设计和已实施的水土保持措施工程量及投资见表 3.3.3.1。

表3.3.3.1

主体设计的水土保持措施量及投资表

防治区及措施名称				数量			主体设计		
		单位	主体 设计	已实施	未实施	单价 (元)	(元)	已实施(元)	未实施(元)
建筑物区									
临时	临时苫盖	m ²	23000	23000	0	515.91元/100 m ²	118659.3	128977.5	0
措施	临时拦挡	m	800	800	0	100元/m	80000	80000	0
					道路线	录化区			
工程	土地整治	m ²	7822	7822	0	1067.1元/hm²	834.68	834.68	0
措施	雨水管	m	667	667	0	200元/m	133400	133400	0
临时	苫盖	m^2	19400	19400	0	515.91元/100 m ²	100006 54	100086.54	0
措施	占血 m²		19400	19400	U	313.91/L/100 III-	100080.34	100080.34	U
植物	绿化	m^2	7822	0	7822	200元/100 m ²	1564400	24000	1324400
措施	冰化	111	1022	U	1022	2007u/100 III-	1304400	Z4000	1324400

4 水土流失分析与预测

4.1 水土流失现状

根据《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007)及《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T 50434-2018)的规定,项目区属于北方土石山区(III)-华北平原区(III-5)-黄泛平原防沙农田防护区(III-5-3fn)-中南部黄沁河平原农田防护保土区(IV-4nt),容许土壤流失量200 t/km²·a。项目区土壤侵蚀强度分布图见附图2。

依据《全国第二次土壤侵蚀遥感调查图》,结合外业实地调查,项目区所在区域为平原区,土壤侵蚀类型为水力侵蚀,侵蚀表现形式为溅蚀、面蚀和沟蚀,侵蚀强度为微度。根据当地水土保持有关资料,结合外业实地调查,以及从当地水利部门收集相关资料,确定项目区平均土壤侵蚀模数为180 t/km²·a。

4.2 水土流失影响因素分析

4.2.1 水土流失影响因素

根据本项目的相关技术资料及现场勘查结果,本项目位于焦作市武陟县乔庙镇,自然因素和人为因素是造成本项目区水土流失的主要原因。自然因素有地形地貌、地面组成物质、植被及降雨等。项目区地貌类型为平原,地势北高南低,地面物质组成单一,区域林草植被较少,降雨时土壤会产生雨滴溅蚀,随地势进一步可发展为面蚀和沟蚀,是造成水土流失的重要因素。人为因素主要是由于在工程建设过程中,直接改变了原地形地貌,不可避免地破坏植被、扰动地表,使原有地表的抗蚀力降低,是造成水土流失的主要因素。建筑物工程区域易造成水土流失的有基坑开挖、地面施工扰动、基坑回填等及道路广场工程易造成水土流失的主要是施工人员扰动土壤等。

根据本项目相关资料,本项目总扰动地表面积41669.06 m^2 ,挖方量9685 m^3 ,填方量9685 m^3 ,余方量0 m^3 。

4.2.2 扰动地表、损毁植被面积预测

扰动地表、损毁植被面积的预测,主要是通过查阅本项目备案书和相关技术资料, 并采取实地调查的方式。确定本项目扰动地表面积和损毁植被面积为41669.06 m²。

表4.2.1

本项目扰动地表面积统计表

项目组成	占地类型	占地性质	占地面积(hm²)
建筑物工程	工业用地	永久占地	2.2326
道路绿化工程	工业用地	永久占地	1.9343
合计	/	/	4.1669

4.2.3废弃土(石、渣、灰、矸石、尾矿)量

本项目总挖方量为9685 m³,总填方量9685 m³,无多余方量。

4.3 土壤流失量预测

4.3.1 预测单元

根据地形地貌、扰动方式、扰动后地表的物质组成、气象特征等相近的原则划分为建筑物区和道路绿化区2个预测单元。

根据工程平面布置结合地形图确定各预测单元的预测面积,其中自然恢复期预测面积扣除了建筑物占地、地面硬化,详见下表:

表 4.3.1.1

预测单元面积统计表

序号	预测单元	施工期(hm²)	自然恢复期(hm²)
1	建(构)筑物区	2.2326	/
2	道路绿化区	1.9343	0.7822
3	合计	4.1669	0.7822

4.3.2 预测时段

根据《生产建设项目水土保持技术标准》(GB 50433-2018)中水土流失预测时段的划分,本项目属建设类项目,因此本方案预测时段分为施工期(含施工准备期)和自然恢复期。

- (1) 施工期:本项目施工期为2019年1月至2021年5月。对工程建设已产生的水土流失预测按照调查法,调查日期截止到目前,则调查时段为2019年1月至2021年3月。对工程建设未产生的水土流失按照预测法,预测时段为2021年4月至2021年5月。
- (2) 自然恢复期: 自然恢复期为施工扰动结束后,不采取水土保持措施的情况下,土壤侵蚀强度自然恢复到扰动前土壤侵蚀强度所需要的时间,应根据当地自然条件确定,一般情况下湿润区取2年,半湿润区取3年,干早半干旱区取5年。

本项目位于半湿润地区,因此,本项目自然恢复期预测时间确定为3年。

(3) 各分区预测时间:

施工期预测时间应按连续12个月为一年计;不足12个月,但达到一个雨(风)季 长度的,按一年计;不足一个雨(风)季长度的,按占雨(风)季长度的比例计算。 本区属暖温带大陆性季风气候,雨季为每年的6~9月,共4个月。预测时段按最不利 因素考虑。

各预测单元、各时段调查与预测时段详见下表。

表 4.3.2.1

调查、预测时段统计表

77 141 14 -	调查	时段 (a)		预测时段 (a)			
预测单元	起讫月份	施工期	自然恢复 期	起讫月份	施工期	自然恢复期	
建筑物工程区	2019.1~2021.3	1	/	/	/	/	
道路绿化工程区	2019.6~2021.3	1	/	2021.4~2021.5	/	3	

4.3.3 土壤侵蚀模数

(1) 土壤流失强度预测

①扰动前侵蚀模数

参照《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007),根据各建设区的植被、土地利用、地形地貌等因素确定不同分区的扰动前侵蚀模数。根据现场调查分析,同时结合当地水土保持规划综合确定项目区扰动前土壤侵蚀模数为180 t/km²·a。

②扰动后土壤侵蚀模数

扰动后土壤侵蚀模数采用经验法,经咨询当地有关专家,在实地调查基础上,综合分析确定本项目的扰动后(施工期)、自然恢复期的土壤流失侵蚀模数,见表4.3.3.1。

表4.3.3.1

本项目各分区扰动后土壤侵蚀模数表

预测单元	扰动前土壤侵蚀模 数(t/km²·a)	扰动后(施工期) 土壤侵蚀模数	自然恢复期土壤侵蚀模数 (t/km²·a)		
	数(VKIII a)	(t/km²⋅a)	第一年	第二年	第三年
建筑物工程区	180	2500		/	
道路绿化工程区	180	2000	1500	1000	180

4.3.4 预测结果

根据上述分析预测的各单元土壤侵蚀模数、面积和各时段预测时间,按照《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)4.5.3条规定的土壤流失量预测公式,根据各预测单元的土壤侵蚀模数、面积和时段预测时间,预测计算水土流失量。水土流失预测量按以下公式计算。

1) 水土流失量预测计算公式:

$$W = \sum_{j=1}^{2} \sum_{i=1}^{n} F_{ji} \times M_{ji} \times T_{ji}$$

2) 新增土壤流失量计算公式:

$$\Delta W = \sum_{i=1}^{2} \sum_{i=1}^{n} F_{ji} \times \Delta M_{ji} \times T_{ji}$$

式子中:

W——土壤流失量(t);

 ΔW ——新增土壤流失量(t);

i — 预测单元, i=1, 2, 3, ..., n-1, n;

i——预测时段, i=1, 2, 指施工期(含施工准备期)和自然恢复期;

 F_{ji} ——第j预测时段,第i预测单元的面积(km²);

 M_{ji} ——第j预测时段,第 i 预测单元的土壤侵蚀模数,[t/(km 2 ·a)];

 ΔM_{ji} ——第j预测时段,第i预测单元的新增土壤侵蚀模数,[t/(km²·a)];

 T_{ji} ——第j预测时段,第i预测单元的预测时段长(a)。

根据以上分析确定的预测时段、土壤侵蚀模数、预测分区划分的水土流失面积计算水土流失量。本项目水土流失总量为308.38 t,新增281.65 t。各单元,各时段土壤流失量详见表4.3.4.1~表4.3.4.7。

表4.3.4.1

施工期水土流失量调查表

		一 工作 、畑 土		扰动前土			水土流失	量(t)	(t)			
水土	上流失预测 单元	面积 (hm²)	调查 时间 (a)	壤侵蚀模 数 (t/km²·a)	施工期侵蚀模 数(t/km²·a)	背景值	施工期	新增	总计			
建筑	[物工程区	2.23	2	180	2500	8.04	111.63	103.5	119.67			
道路	F 绿化工程 区	1.93	2	180	2000	6.96	77.37	70.41	84.34			
	合计	4.16	/	/	/	15.0	189.0	174.0	204.0			

表4.3.4.2

施工期水土流失量预测表

1. 1 分 4 茲 炯	面积 预测		扰动前					
水土流失预测 单元	(hm 2)	时间 (a)	土壤侵蚀模数 (t/km²·a)	施工期侵蚀模数 (t/km²·a)	背景值	施工期	新增	总计
建筑物区	2.23	1	180	2500	4.02	55.82	51.8	59.83
道路绿化区	1.93	1	180	2000	3.48	38.69	35.2	42.17
合计	4.16	/	/	/	7.5	94.5	87.0	102.0

表4.3.4.3

自然恢复期土壤流失量预测表

水土流失	面积		扰动前侵蚀模 数(t/km²·a)	扰动后侵蚀 模数	水土流失量(t)			
预测单元	(11111)	(a)	数(VKIII a)	(t/km²·a)	背景 值	自然恢复 期	新增	总计
	0.78	1	180	2000	1.41	15.64	14.2 4	17.05
绿化区	0.78	1	180	1000	1.41	7.82	6.41	9.23
	0.78	1	180	180	1.41	1.41	0.0	2.82
合计	0.78	3	/	/	4.23	24.87	20.6	29.1

表4.3.4.4

水土流失调查和预测成果汇总表

水土流失	水土流失量	水土流失总量 (t)			新增水土流失量(t)			
预测单元	背景值(t)	施工期	自然恢复期	小计	施工期	自然恢复期	总计	
建筑物区	12.06	167.45	/	167.45	155.39	/	155.39	
道路绿化区	14.67	116.06	24.87	140.93	105.61	20.65	126.26	
合计	26.73	283.5	24.87	308.38	261.0	20.65	281.65	

根据上述调查和预测结果,水土流失重点防治时段为施工期,重点防治部位为建筑物工程区。工程建设将造成水土流失总量308.38 t,新增水土流失总量281.65 t。施工期水土流失总量283.5 t,本项目自然恢复期水土流失总量为24.87 t。建筑物区水土流失量167.45 t,道路绿化区140.93 t。

因此,本方案将建筑物工程区作为重点防治区,水土流失重点防治时段为施工期。

5 水土保持措施

5.1 防治区划分

5.1.1 分区目的与依据

对项目区进行水土流失防治分区的目的是为了合理布设防治措施,便于进行分区 防治措施典型设计,并计算防治措施工程量。

根据《生产建设项目水土保持技术标准》(GB 50433-2018),水土流失防治分区应根据实地调查(勘测)结果,在确定的防治责任范围内,依据:

- (1) 项目区的地形地貌特征和水土流失现状、水土保持情况;
- (2) 项目区土壤侵蚀类型及强度、水土保持特点及效果等现场调查;
- (3) 在确定的水土流失防治责任范围内,依据主体工程布局、施工扰动特点、 工程建设时序、地貌特征、自然属性、水土流失影响等进行分区:
 - (4) 主体工程总平面布置。

5.1.2 分区原则

- (1) 各区之间应具有显著差异性:
- (2) 同一区内造成水土流失的主导因子和防治措施应相近或相似;
- (3) 根据项目的繁简程度和项目区自然情况, 防治区可划分为一级或多级;
- (4) 一级区应具有控制性、整体性、全局性,线型工程应按土壤侵蚀类型、地形地貌、气候类型等因素划分一级区,二级区及其以下分区应结合工程布局、项目组成、占地性质和扰动特点进行逐级分区:
 - (5) 各级分区应层次分明, 具有关联性和系统性。

5.1.3 水土流失防治区

根据本项目工程总体布局情况,本工程是点型工程。考虑项目区地貌类型、地质、水土流失特点、区域水文、气象、植被、土壤等自然条件相一致,兼顾分区与主体功能的相互协调、各功能区的完整性、水土保持措施布设、水土流失监测及水土保持实施的可行性。且防治分区的划分还要考虑各单元工程特征、施工工艺、人为造成水土流失的形式和特点等。按照以上分区原则,将本项目划分为2个防治区,即建河南宏程矿业勘察设计有限公司

筑物工程防治区、道路绿化工程防治区,项目防治分区情况可见表5.1.3.1。

表5.1.3.1

防治分区情况表

序号	防治分区	面积(hm²)	主要施工特点		
1	建筑物工程防治区	2.23	基础开挖、回填		
2	道路绿化工程防治区	1.93	管沟开挖、回填、土地整治、绿化		
3	合计	4.16	/		

5.2 措施总体布局

5.2.1 防治目标

本项目为建设类项目,根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》(办水保[2013]188号)、《河南省水土保持规划》(2016~2030年)和《焦作市水土保持规划》(2018-2030),项目区属于黄泛平原风沙省级水土流失重点预防区。结合《生产建设项目水土流失防治标准》(GB50434-2018)中的规定,水土流失防治标准执行北方土石山区一级标准。

5.2.2 措施总体布局原则

- (1) 措施总体布局应结合工程实际和项目区水土流失特点,因地制宜、因害设防,提出总体防治思路,明确综合防治措施体系,工程措施、植物措施以及临时措施有机结合;
- (2) 对主体工程设计中具有水土保持功能工程进行评价,借鉴当地同类生产建设项目防治经验,布设防治措施:
 - (3) 注重排水与先进制造园区管网的衔接, 防止对园区造成淤积堵塞;
 - (4) 注重土壤防护, 防止土壤裸露, 优先布设植物措施, 限制硬化面积;
 - (5) 注重施工期的临时防护,对临时堆土、裸露地表及时防护。

5.2.3 水土保持措施总体布局

本着"预防为主、保护优先、防治结合"的原则,主体工程设计及实际施工情况为主要设计依据,针对主体工程设计中具有水土保持功能措施的实施及规划状况,对已有详细设计的措施进行合理的评价,对仅有规划的措施进行适当的补充设计或提出设计要求,并根据各防治分区的具体情况,新增设计水土保持措施,形成完善的综合防治措施体系。根据划分的建(构)筑物工程防治区和道路绿化工程防治区2河南宏程矿业勘察设计有限公司

个防治分区,水土保持措施如下:

(1) 建筑物工程防治区

建筑物工程防治区在施工过程中设置临时拦挡800 m, 对施工裸露面采取临时苫盖措施23000 m²。

方案新增1000 m长的临时排水沟和1座沉沙池。

(2) 道路绿化工程防治区

根据现场勘查,道路绿化工程防治区主体设计为道路下方敷设雨水管网与先进制造园区的雨水管网连接。道路旁边的绿化区域采取栽植灌木和铺设草皮相结合的绿化措施。在施工期间,裸露土面已采取临时苫盖措施。项目在施工后期对绿化区域进行了场地平整和覆土,场地平整面积19343.06 m²,覆土量2419 m³。

本方案新增蓄水池用于绿化苗木浇灌。水土流失防治措施体系如图5.1。

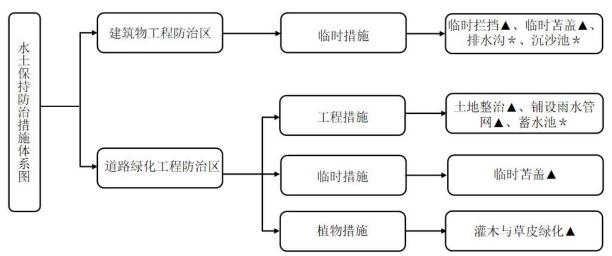


图5.1 项目水土保持防治措施体系图

注: ▲为主体设计的水保措施, *为新增措施

5.2.4 水土保持措施设计标准

根据本工程主体设计资料及《水土保持工程设计规范》(GB 51018-2014)相关设计要求,本项目水土保持工程设计标准如下:

(1) 绿化工程设计标准

本工程场内绿化注重景观效果,绿化标准采用园林式绿化工程标准,园林式绿化已符合下列规定:灌木株行距可采用0.3 m×0.3 m。

5.3 分区措施布设

5.3.1 建筑物工程防治区

建筑物工程防治区主体设计主要为临时拦挡、临时苫盖。经统计,建筑物工程防治区需临时拦挡800 m, 临时苫盖23000 m²。新增临时土质排水沟1000 m和1座沉沙池,建筑物工程防治区水土保持措施工程量见下表。

表5.3.1.1

建筑物防治区水土保持措施工程量

防治分区	措施类型	防治措施	单位	数量	备注
	临时措施	临时拦挡	m	800	수 <i>(</i> +)지) L
		临时苫盖	m ²	23000	主体设计
建筑物工程防治区		临时排水沟	m	1000	
		沉沙池	座	1	方案新增

5.3.2 道路绿化工程防治区

根据主体设计,厂区内的雨水由雨水口收集后,经雨水管网收集排入就近的先进制造园区雨水管网,雨水管采用双壁波纹管,管径为 DN300。经统计,道路绿化工程防治区共布设雨水管网667 m。临时措施主要有裸露面临时苫盖19400 m²。土地整治7822 m²。灌木与草皮绿化7822 m²。新增蓄水池1座。道路绿化工程防治区水土保持措施工程量见下表5.3.2.1。

表5.3.2.1

道路绿化工程防治区水土保持措施工程量汇总表

防治分区	措施类型	防治措施	单位	数量	备注
		土地整治	m^2	7822	主体设计
光明 / / / · 一 和	工程措施	铺设雨水管网	m	667	土体设计
道路绿化工程		蓄水池	座	1	方案新增
防治区	临时措施	裸露面临时苫盖	m^2	19400	主体设计
	植物措施	灌木与草皮绿化	m^2	7822	主体设计

5.3.3 防治措施工程量汇总

本项目水土保持防治措施工程量汇总详见下表。

表5.3.3.1

水土保持防治措施工程量汇总表

防治分区	措施类型	防治措施	单位	数量	备注
建筑物工程防治区		临时拦挡	m	800	主体 批斗
	临时措施	临时苫盖	m ²	23000	主体设计
	10111111111111111111111111111111111111	临时排水沟	m	1000	一大安
		沉沙池	座	1	方案新增

		土地整治	m ²	7822	主体设计
	工程措施	铺设雨水管网	m	667	_ ,, ,, ,,
道路绿化工程防治区		蓄水池	m^3	55	方案新增
	植物措施	植物绿化	m ²	7822	主体设计
	临时措施	临时苫盖	m ²	19400	工件及り

根据现场调查和资料分析,主体工程设计中可界定为水土保持措施的工程包括: 土地整治、施工裸露面临时苫盖、永久雨水管网的布设和管网开挖时的临时堆土苫 盖、植物绿化措施。

5.4 施工要求

5.4.1 施工方法

本项目水土保持措施主要包括工程措施、植物措施和临时措施。工程措施主要为 土地整治;植物措施包括栽植灌木和铺草皮;临时措施包括临时拦挡、临时排水沟、 沉沙池等。主要施工方法如下:

(1) 工程措施施工方法

土地整治

整地前已对杂物进行清理,人工捡除石块、石砾和建筑垃圾,采用拖拉机牵引铧犁进行翻地,耕深0.2~0.4 m,施农家土杂肥增强土地肥力,使其满足植被生长要求。

(2) 植物措施施工方法

1) 施工准备

现场踏勘,先了解施工部位或现场环境条件,包括土壤、水源、运输和天然肥源等。对工程中使用的各类苗木,提前进行实地考察,了解苗木数量、质量和运输条件,做好挖掘、包装和运输的最佳方案。落实苗木种植过程中所需的土基、绑扎材料以及劳动力、设备和材料的工作。种植前,对土壤肥力、pH 值等指标进行检测,对土壤进行改良,确保植物生长。

2) 整地

整地前进行杂物清理,捡除石块、石砾,并进行粗平,填平坑洼,然后对绿化区进行土壤翻松、碎土,再进行细平,形成种植面。整平后,按设计要求人工用石灰标出片状分布的不同灌木草的区域分界线,根据树种类型确定间距。

3)种苗选择

灌木采用达到设计标准的树苗:草籽种子纯净度达90%以上,发芽率达85%以上, 草皮生长状态良好, 无病虫害。

4) 栽植方法

灌木采用穴植方法, 在栽植时注意其栽植的技术要点, 栽植深度以超过原根系 5~10 cm为准。种植工序为: 挖坑一栽植—回填—浇水—压实: 苗木定植时苗干竖 直,根系舒展,深浅适当;填土一半后进行提苗踩实,最后覆上虚土。

5)种植季节

在春季进行移栽。

6) 抚育管理

抚育采用人工进行,抚育内容包括:松土、培土、浇水、施肥、补植树苗及必要 的修枝和病虫害防治等,抚育时间在为杂草丛生、枝叶生长旺盛的6月份进行,8月 下旬至9月上旬已进行第二次抚育。抚育管理分2年进行,第一年抚育2次,第二年抚 育1次。定植后已及时浇水、保证苗木成活及正常生长、对缺苗、稀疏或成活率没有 达到要求的地方, 在第二年春季及时进行了补植、补播, 根据其生长情况应及时浇 水、松土、除草、追肥、修枝、防治病虫害等。植物措施建植后,落实好林地的管 理和抚育责任,加强对周边种植树草的园艺式修剪和管护,以建立良好的生态景观。

(3) 临时措施施工方法

本项目临时措施包括施工临时拦挡、临时排水和沉沙,施工结束后进行拆除。

5.4.2 实施进度安排

- (1) 遵循"三同时"制度,按照主体工程施工组织、建设工期、工艺流程,坚 持积极稳妥、有余地、尽快发挥效益的原则,以水土保持分区措施布设、施工的季 节性、施工顺序、措施保证、工程质量和施工安全,分期设施,合理安排,保证水 土保持工程施工的组织性、计划性、有序性以及资金材料和机械设备等资源的有效 配,确保工程近期完成。
- (2) 先工程措施再植物措施,工程措施一般应安排在非主汛期,大的土石方工 程尽可能避开汛期。植物措施应以春、秋季为主。施工建设中,应按"先挡后弃" 的原则,先期安排水上保持措施的设施。结合四季特点和工程建设特点及水土流失 河南宏程矿业勘察设计有限公司 37

类型, 在适宜的季节进行相应的措施布设, 应避开洪水危害等。

综上所述,通过本方案结合建设方设计的水土保持措施,能够有效地防治工程建设造成的水土流失,最终改善生态环境,维护生态平衡,从水土保持角度分析,不存在制约性因素,项目建设可行。

6 水土保持投资估算及效益分析

6.1 投资估算

6.1.1 编制原则及依据

6.1.1.1 编制原则

- (1) 投资估算编制的项目划分、费用构成、表格形式等依据《开发建设项目水 土保持工程概(估)算编制规定》编写。
- (2) 投资估算的价格水平年、人工单价、主要材料价格、施工机械台时费与主 体工程一致。
 - (3) 估算定额、取费项目及费率、工程单价与主体工程一致。
- (4) 主体工程估算定额中未明确的,采用水土保持或相关行业的定额、取费项 目及费率。

6.1.1.2 编制依据

- (1) 《水土保持工程概(估)算编制规定》(水利部水总[2003]67号);
- (2)《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改 价格[2015]299号);
- (3)《河南省<水土保持补偿费征收使用管理办法>实施细则》(豫财综 [2015]107号);
- (4) 《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》(办财 务函[2019]448号);
- (5) 河南省发改委、财政厅、水利厅《关于我省水土保持补偿费收费标准的通 知》(豫发改收费[2018]1079号);
- (6) 《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税标准的通知》(办财务 函〔2019〕448号):
 - (7) 本方案设计的水土保持工程量。

6.1.2 编制说明及估算成果

(1) 编制说明

① 价格水平年

本方案新增措施价格估算水平为2020年第四季度的价格水平。

(2) 编制方法

① 本方案编制投资估算包括主体工程设计中已有的水土保持措施投资与本方案 水土保持新增投资一并计列:

本方案编制投资估算范围包括水土保持工程措施、植物措施、临时措施和其它费用;

- ② 水土保持工程投资估算中所采用的单价已根据有关规定综合考虑了直接费、间接费和法定利润因素,即为综合单价;
 - ③ 单项工程的投资估算由工程单价乘以工程量得出。
 - (3) 计算标准
 - 1) 工程措施及植物措施工程费

计算方法: 水土保持工程措施和植物措施工程单价由直接工程费、间接费、建设单位利润和税金组成。工程单位各项的计算或取费标准如下:

- ① 直接费: 根据定额计算。
- ② 其它直接费: 工程措施按直接费的2%计算; 植物措施按直接费的1%计算。
- ③ 现场经费: 见表6.1.2.1。
- ④ 间接费率: 见表6.1.2.2。

表6121

现场经费费率表

序号	工程类别	计算基础	间接费费率(%)
_	工程措施		門按頻頻竿(%)
1	土石方工程	直接工程费	5.0
2	混凝土工程	直接工程费	6.0
=	植物措施	直接工程费	4.0
Ξ	其他工程	直接工程费	5.0

表6.1.2.2

间接费费率表

序号	工程类别	计算基础	间接费费率(%)
_	工程措施	月升至仙	内按负负平(70)
1	土石方工程	直接工程费	4.0
2	混凝土工程	直接工程费	4.3
3	基础处理工程	直接工程费	6.5
4	其他工程	直接工程费	4.4
=	植物措施	直接工程费	3.3

(4) 基础单价

①人工单价

根据《河南省建筑工程标准定额站文件》(豫建标定[2020]23 号),确定本项目 人工单价按照普工13元/工时计算(综合人工单价 104 元/工日)。

② 材料价格

建筑物工程材料价格和植物工程苗木价格,根据市场调查,按当地市场加运杂费及采购保管费计算。施工用水、电价格:经综合分析计算,采用价格为:电0.66元/度,水3.75元/m³,柴油7.5元/L。

③ 施工机械使用费

施工机械使用费采用《生产建设项目水土保持工程估(概)算定额》附录中施工机械台时费定额以及《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》(办财务函[2019]448号)中确定的调整系数计算,其中折旧费除以1.13调整系数,修理及替换设备费除以1.09调整系数,安装拆卸费不变。

④ 建设单位利润:

工程措施费按直接工程费和间接费之和的7%计算:

植物措施费按直接工程费和间接费之和的5%计算。

⑤ 税金:按增值税税率9%计算。

⑥ 工程单价

各项工程措施和植物措施的工程单价参照原主体工程设计和《生产建设水土保持工程概(估)算定额》和市场价格进行计算。其中各项工程措施的工程单价分析和各项植物措施的工程单价分析详见成果表。

⑦临时工程费

1) 临时防护工程

临时防护工程包括为防止施工期水土流失而采取的各项临时防护措施,各项临时 防护设施按相应单价计算,分子项计列。

2) 其它临时工程

工程措施和植物措施投资之和的1.5%进行编制。

⑧ 独立费用

- 1) 建设管理费:建设管理费应分区新增措施之和的2%计算,并与主体工程建设管理费合并使用:
 - 2) 科研勘测设计费: 本工程勘测设计费为5.0万元;
 - 3) 预备费

根据项目实际情况,不计列。

4) 水土保持补偿费

根据《河南省<水土保持补偿费征收使用管理办法>实施细则》(豫财综 [2015]107号)的规定,本工程属于一般性生产建设项目,水土保持补偿费按照征占 地用土地面积计征;根据《河南省发展和改革委员会关于我省水土保持补偿费收费 标准的通知》(豫发改收费〔2018〕1079号)文件,水土保持补偿费征收缴纳标准 按1.2元/m²征收,不足1m²的按1m²计,本项目其余征占用地土地面积41669.06 m²,因此本项目水土保持补偿费为50002.78元。

(5) 投资估算结果

本项目水土保持总投资214.98万元,其中主体工程已有投资199.73万元,方案新增5.13万元。独立费用5.1万元(建设单位管理费0.1万元;科研勘测设计费5.0万元),水土保持补偿费50002.87元。

水土保持投资概算见表6.1.2.3~6.1.2.10。

表6.1.2.3

水土保持投资估算总表 单位:万元

项目名称	- 11111111/20		方案	新增投资			方案总投资
第一部分 分区措施费	主设投资	工程措施	植物措施费	临时措施	独立费用	小计	力条芯权货
建筑物区	17.44	/	/	1.11	/	18.55	17.55
工程措施	0	0	/	/	/	/	/
植物措施	0	/	0	/	/	/	/
临时措施	17.44	/	/	1.11	/	18.55	18.55
道路绿化区	179.87	4.02	/	/	/	183.89	183.89
工程措施	13.42	4.02	/	/	/	17.44	17.44
植物措施	156.44	/	0	/	/	156.44	156.44
临时措施	10.01	/	/	/	/	10.01	10.01
第二部分 独立费用	/	/	/	/	5.1	5.1	5.1
建设管理费	/	/	/	/	0.1	0.1	0.1
科研勘测设计费	/	/	/	/	5.0	5.0	5.0
一至二部分之和	197.31	4.02	/	1.11	5.1	207.54	/
水土保持补偿费	/	/	/	/	/	5.0	5.0
水土保持工程总投资	/	/	/	/	/	/	214.98

建筑物工程区水土保持措施投资估算表 单位:万元 表6.1.2.4

			单			投资		
防治	計構施	工程量名称	位		新增投 资	主设投资	总投资	备注
	临时拦挡	临时拦挡	m^2	800	0	8.0	8.0	已实施
1671.14.4	临时苫盖	土工布	m ²	23000	0	11.87	11.87	已实施
临时措施	临时排水	土质排水沟	m	1000	0.41	0	0.41	已实施
	临时沉沙	沉沙池	m ³	4.5	0.71	0	0.71	已实施
		20.98	/					

道路绿化工程区水土保持措施投资估算表 单位:万元 表6.1.2.5

		A	单			投资			
防治	措施	工程量名称	位	数量	新增投 主设投资 总投资		总投资	备注	
	土地整治	土地整治	m^2	7822	0	0.083	0.083	已实施	
工程措施	雨水管网	铺设雨水管网	m	667	0	13.34	13.34	已实施	
	蓄水池	蓄水池	m^3	55	4.02	0	4.02	未实施	
临时措施	临时苫盖	土工布	m ²	19400	0	10.01	10.01	已实施	
植物措施	绿化	植树种草	m ²	7822	0	156.44	156.44	未实施	
		183.89	/						

表6.1.2.6

独立费用投资估算表

序号	费用名称	计算方法	金额(万元)
777	独立费用	-	5.1
1	建设管理费	应按分区新增措施之和的2%计算,并与主体工程管理费合 并使用,以满足水土保持专项验收和评估工作的需要	0.1
2	科研勘测设计费	参照《工程勘察设计收费管理规定》,并结合项目实际。	5.0

表6.1.2.7

水土保持补偿费计算表

项目	面积 (m²)	单价 (元/m²)	金额(元)
水土保持补偿费	41669.06	1.2	50002.87

表6.1.2.8

工程单价汇总表

序				其中							
伊 号	工程名称	单位	单价	人工费	材料费	机械费	其他直 接费	现场经费	间接费	计划 利润	税金
1	土地整治	1 hm^2	1067.1	247	90.4	484.8	16.4	41.11	35.2	64.05	88.11
2	铺设土工布	100 m ²	515.91	208	130.97	0	67.79	16.95	18.64	30.96	42.6
3	人工挖排水沟	100 m ³	2043.69	1528.8	45.86	0	31.49	78.73	67.4	122.66	168.74
4	沉沙池	座	7068.4	549.9	508.89	0	21.18	63.53	4917.03	424.24	583.63
5	蓄水池	55m ³	40201.7	19617	12371.5	207.66	643.92	32.2	1314.9	2393.1	3292.22

表6.1.2.9

施工机械台班费汇总表

上					一类费用		-	-类费用
序号	名称及规格	定额编号	台时费	折旧费	修理及替 换设备费	安拆费	人工费	动力燃料费
1	胶轮车	3059	0.812	0.232	0.59	/	/	/
2	拖拉机37kW	1043	60.6	2.69	3.35	0.16	16.9	37.5

表6.1.2.10

主要材料单价汇总表

序号	名称	单位	规格	单价 (元)
1	水	m^3	/	3.75
2	电	kw∙h	/	0.66
3	柴油	kg	/	7.5
4	砂砾	m^3	中、粗砂	268.0
5	土工布	m ²	/	1.2

6.2 防治效益分析

本方案水土保持措施实施后,结合主体工程中原有的水土保持措施将使项目建设过程中产生的水土流失能够得到有效地控制,项目区生态环境得到显著改善,同时可以产生良好的社会效益和经济效益。

(1) 生态效益

水土保持方案实施后,通过主体工程设计的防护措施和本水土方案的补充设计措 施,项目区水土流失可以得到有效的控制。生态效益用水土流失治理度、土壤流失 控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率六项指标反映; 根据六项指标的计算方法统计得出本项目设计水平年有关工程建设和水土保持各类 面积与指标值。

①水土流失治理度:

水上流失治理度为项目水上流失防治责任范围内水上流失治理达标面积占水上流 失面积的百分比。

本工程建设区总面积为41669.06 m², 水土流失防治责任范围总面积为41669.06 m²。到设计水平年时, 防治责任范围内水土流失治理达标面积为41669.06 m², 则项 目区水土流失治理度达99.9%,超过防治目标值95%。

②土壤流失控制比: 土壤流失控制比为项目水土流失防治责任范围内容许土壤流 失量与治理后每平方千米年平均土壤流失量之比。

通过各项水土保持措施,到设计水平年,防治责任范围内按方案采取水土保持措 施后,项目区的土壤侵蚀模数为180 t/km².a,项目区容许土壤侵蚀模数为200 t/km².a, 本工程土壤流失控制比为1.11,超过防治目标值1.0。

③渣土防护率: 经现场调查, 本工程场内开挖土全部用于厂区内填方, 施工过程 中临时堆土共计2418.7 m³,全部实施临时苫盖、排水、临时拦挡等措施,到设计水 平年渣土防护率为99.9%,超过目标值98%。

④表土保护率

表土保护率为项目水土流失防治责任范围内保护的表土数量占可剥离表土总量的 百分比。

建设项目已建成投产,场地平整以及建(构)筑物基础开挖等对表土扰动较大的 工作已经完成,且平整和开挖过程中未对表土进行剥离,本方案不再设计表土剥离 措施,表土剥离土方量也不再进行计算,故不再计算表土防护率防治指标。

⑤林草植被恢复率:

林草植被恢复率为项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占可恢复林草植 河南宏程矿业勘察设计有限公司 45

被面积的百分比。

到设计水平年,植物措施面积达到7822 m²,项目区可绿化措施面积7822 m²,林 草植被恢复率达100%,超过防治目标值97%。

⑥林草覆盖率:林草覆盖率为项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占总 面积的百分比。

由于该工程建设以厂房为主, 用地类型为工业用地, 建筑密度较高, 结合该项目 的实际布局以及工程特点, 林草覆盖率在能够满足水土保持要求的基础上适当降低, 防治目标中林草覆盖率小于 20%。到设计水平年,林草植被达标总面积7822 m²,项 目区永久占地面积41669.06 m², 项目区林草覆盖率为18.77%, 超过防治目标值 18.0%

以上指标均超过本方案确定的防治目标,详见表6.1.2.11。

表6.1.2.11

水土保持方案各项措施指标计算表

评估指标	计算依据	单位	合计	计算结果	
表土保护率	保护的表土数量	m ²	/		
	可剥离的表土数量	m ²	/	/	
	设计达到值(%)		/		
	水土流失治理达标面积	m^2	41669.06		
水土流失治理度	水土流失总面积	m^2	41669.06	超过目标值95%	
	设计达到值	(%)	99.9		
	侵蚀模数达到值	$t/(km^2 \cdot a)$	180		
土壤流失控制比	侵蚀模数容许值	$t/(km^2 \cdot a)$	200	超过目标值1.0	
	设计达到	值	1.11		
	挡护的临时堆土数量	m^3	1036.2		
渣土保护率	临时堆土总量	m^3	1036.2	超过目标值98%	
	设计达到值(%)		100%		
林草植被恢复率	林草植被面积	m^2	7822		
	可恢复林草植被面积	m^2	7822	超过目标值97%	
	设计达到值(%)		100		
林草覆盖率	林草植被面积	m^2	7822		
	总面积	m^2	7822	超过目标值18.0%	
	设计达到值	(%)	18.77%		

(2) 社会效益

方案措施实施后,建筑物工程防治区和道路绿化工程防治区将得到很好的防护, 对保障项目安全运行将起到重要作用,可以有效地减少水土流失量259.37 t,防控土 壤侵蚀, 对当地及周边经济社会的持续发展都将起到积极的促进作用。

(3) 经济效益

水土保持方案措施实施的直接经济效益是:一方面表现在可以保证本项目的正常 安全运行;另一方面表现为水土保持林草措施实施后,每年可为企业增加一定的直 接经济效益。

7 水土保持管理

为贯彻落实《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》和《河南省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》,确保水土保持方案防治措施按"三同时"要求顺利实施,充分发挥水土保持措施的作用,使项目建设过程中水土流失控制在方案目标值以内,促进项目区及周边生态环境良性发展,必须采取相应措施保证实施,需做好如下工作。

7.1 组织管理

根据《中华人民共和国水土保持法》,《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《河南省实施(中华人民共和国水土保持法)办法》中的规定,建设单位应成立水土持管理机构,设专人负责水土保持工作,协调好水土保持方案与主体工程的关系,全力保障水土保持工作的顺利进行,并自觉接受地方水行政主管部门的监督检查。

7.2 后续设计

本项目不需后续设计。后期应加强水土保持措施管护。

7.3 水土保持监理

项目施工期由主体工程监理单位进行水上保持措施监理。

7.4 水土保持施工

为保证本水土保持方案提出的各项防治措施落到实处,依据《水土保持法》规定,水土流失防治实行建设单位负责制。施工单位在施工时,要坚持保护优先的原则,从严控制施工机械的活动范围,按照工程设计要求和施工规程进行施工,尽量减少对地表扰动,保护地表和植被,必要时设立警示牌。

7.5 水土保持设施验收

根据《中华人民共和国水土保持法》第十九条,建设单位应开展水土保持检查工作,加强对水土保持设施的管理与维护,落实管护责任,保障其功能正常发挥。

按照《中华人民共和国水土保持法》第二十七条规定,生产建设项目竣工验收,应当验收水土保持设施;水土保持设施未经验收或者验收不合格的,生产建设项目

不得投产使用。

依据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设计自主验收的通知》(水保[2017]365号)的有关规定,主体工程投入运行前,生产建设单位应按照有关要求自主开展水土保持设施验收。

验收时应明确验收结论,向社会公开验收情况,向水土保持方案审批机关报备验收材料。水土保持设施验收后,建设单位应对水土保持设施进行后续管护与维修,保障其功能正常发挥。

工程措施单价计算表

定额编号: 08045	全面整地-机械施工			单位: 1h	m² 自然方	
工作内容: 挖松、土壤培肥。						
序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)	
-	直接工程费	元	/	/	879.754	
(-)	直接费	元	/	/	822.2	
1	人工	工时	19	13	247	
2	材料费	元	/	/	90.4	
	有机肥	m^3	1	80	80	
	其他材料费	%	13	80	10.4	
3	机械使用费	元	/	/	484.8	
	轮式拖拉机 37kw	台时	8	60.6	484.8	
(=)	其他直接费	%	2	822.2	16.444	
(<u>=</u>)	现场经费	%	5	822.2	41.11	
=	间接费	%	4	879.75	35.19	
Ξ	计划利润	%	7	914.94	64.05	
四	税金	%	9	978.99	88.11	
五	扩大 10%			106.71		
六	合计			1173.81		

工程措施单价计算表

定额编号: 10101	封闭式矩形蓄水池			单位:座矩	形(55 m³)	
	工作内容:池体开挖、池体砌筑、土方回填、池底及池壁抹面等。					
序号	全称及规格	单位	数量	单价(元)或 费率	合计(元)	
_	直接工程费	元	/	/	32872.24	
(-)	直接费	元	/	/	32196.12	
1	人工	工时	1509	13	19617	
2	材料费	元	/	/	12371.46	
	块石	m^3	15.51	200	3102	
	水泥	t	5.75	450	2587.5	
	石子	m^3	10.86	300	3258	
	砂	m^3	12.72	268	3408.96	
	水	m^3	4	3.75	15	
	机械费	/	/	/	207.66	
	胶轮车	台时	242	0.817	197.77	
	其他机械费	%	5	197.77	9.89	
(=)	其他直接费	%	2	32196.12	643.92	
(三)	现场经费	%	5	643.92	32.2	
1	间接费	%	4	32872.24	1314.89	
11	计划利润	%	7	34187.13	2393.1	
四	税金	%	9	36580.23	3292.22	
五	扩大10%				329.22	
六	合计			40201.67		

临时措施单价分析表

定额编号: 03003		单位: 100m²				
工作内容:场内运输、铺设、搭接。						
序号	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	
_	直接工程费	/	/	/	423.71	
(-)	直接费	/	/	/	338.97	
1	人工费	工时	16	13	208	
2	材料费	/	/	/	130.97	
	土工布	m^2	107	1.2	128.4	
	其他材料费	%	2	128.4	2.57	
3	机械费	-	1	-	0	
(=)	其他直接费	%	2	338.97	67.79	
(三)	现场经费	%	5	338.97	16.95	
1-1	间接费	%	4.4	423.71	18.64	
11	计划利润	%	7	442.35	30.96	
四	税金	%	9	473.32	42.6	
五		515.91				

附表 4


临时措施单价分析表

定额编号: 01006		单位: 100m³				
工作内容: 挂线、使用镐锹开挖						
序号	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	
_	直接工程费	/	/	/	1684.89	
(-)	直接费	/	/	/	1574.66	
1	人工费	工时	117.6	13	1528.8	
2	材料费	/	/	/	45.86	
	零星材料费	%	3	1528.8	45.86	
3	机械费	/	/	/	0	
(=)	其他直接费	%	2	1574.66	31.49	
(三)	现场经费	%	5	1574.66	78.73	
=	间接费	%	4	1684.89	67.4	
11	计划利润	%	7	1752.29	122.66	
四	税金	%	9	1874.95	168.75	
五	合计				2043.69	

临时措施单价分析表

		12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			
定额编号: 10073	沉沙池 单位: 座 知			形(4.5m³)	
工作内容:池体开挖、池体砌筑、土方回填、池底及池壁抹面等。					
序号	 名称及规格	单位	数量	单价(元)或 费率	合计(元)
-	直接工程费	元	/	/	1143.5
(-)	直接费	元	/	/	1058.79
1	人工	工时	42.3	13	549.9
2	材料费	元	/	/	508.89
	水泥	t	0.09	356	32.04
	砂子	m^3	0.48	268	128.64
	水	m^3	0.5	3.2	1.6
	机砖	千块	0.81	398	322.38
	其他材料费	%	5	484.66	24.23
(=)	其他直接费	%	2	1058.79	21.18
(三)	现场经费	%	6	1058.79	63.53
=	间接费	%	4	1143.5	4917.03
=	计划利润	%	7	6060.53	424.24
四	税金	%	9	6484.77	583.63
五		合计	·		7068.4

附件1

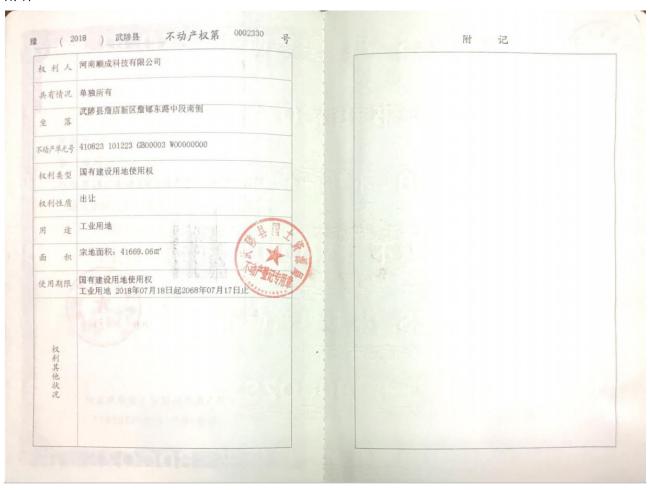

附件2

委托书


河南宏程矿业勘察设计有限公司:

我公司将在武陟县詹店镇产业集聚区东区昌平路建设 年产 110 万套汽车座椅、座套项目,根据《中华人民共和国 水土保持法》等法律法规的有关规定需编制《年产 110 万套 汽车座椅、座套项目水土保持方案报告表》。


现委托贵公司承担,请尽快开展工作。

河南顺成科技有限公司 年 月 日


附图1项目地理位置示意图

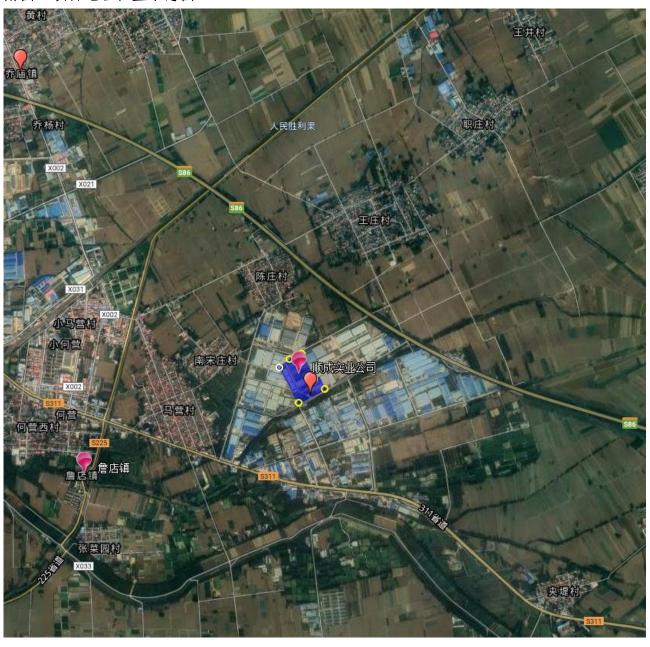


附图 2 土壤侵蚀强度分布图

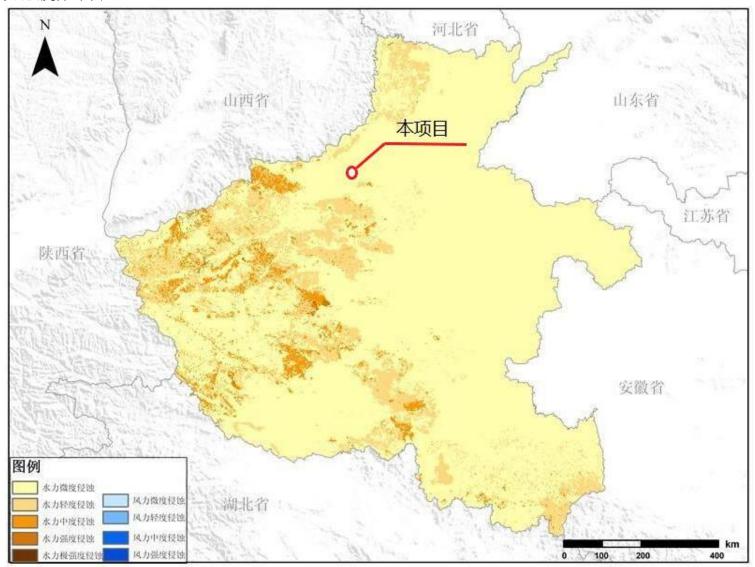


附图 3 水土流失重点防治区划分图

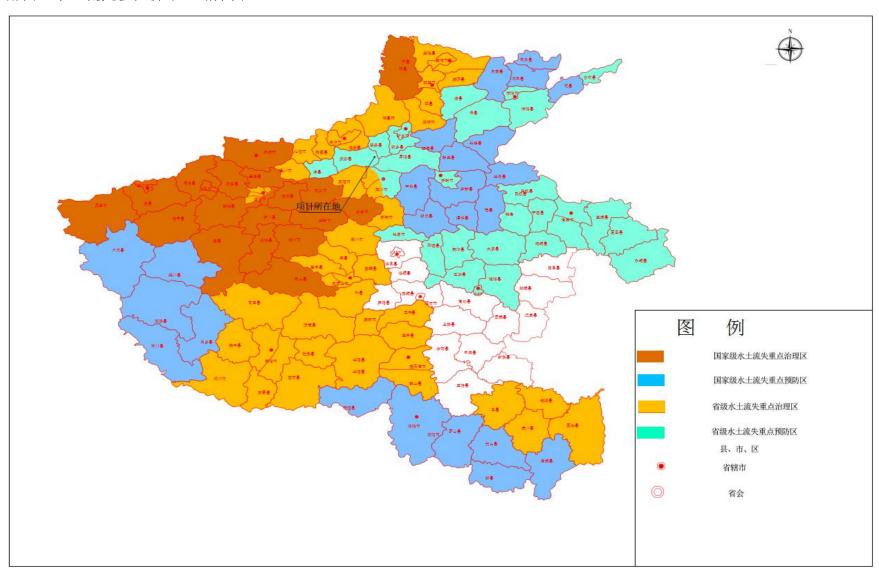

附图 4 武陟县水系图

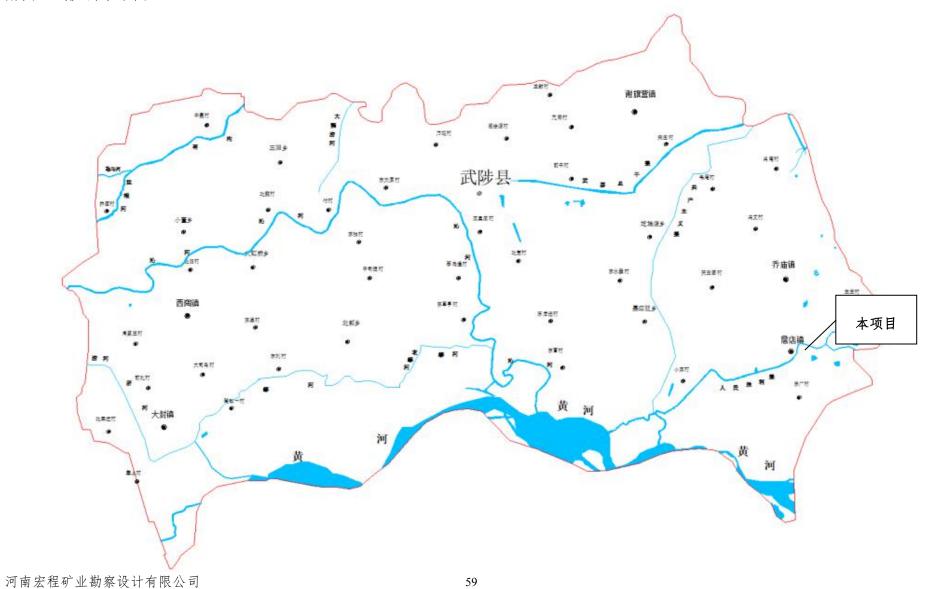


附图5河南顺成科技有限公司厂区平面图

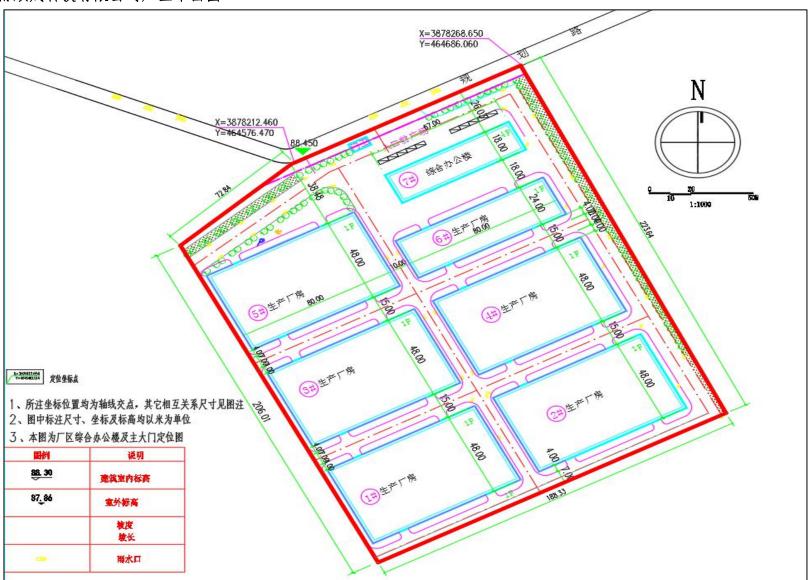

河南宏程矿业勘察设计有限公司

附图 6 防治责任范围、防治分区及水保措施布设图

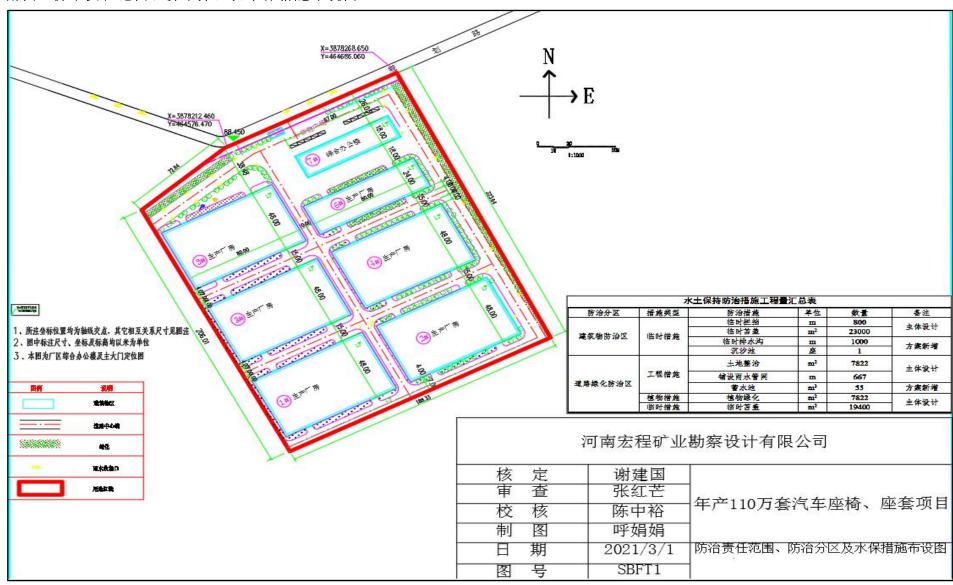

附图7厂区现状图



道路绿化区




道路 (路面硬化)

办公楼 (右上)



道路绿化区(临时覆盖)







道路绿化区 (铺草皮、雨水管网收集口)
